

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK KEPADA CADANGAN MEMBINA 2 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (RUMAH CONTOH) DI ATAS PT 278467 DAN PT 278468 DAN 70 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DI ATAS PT 278469 KE PT 278538, SEBAHAGIAN PT 263924, YANG BERHAMPIRAN LAHAT MINES RESORT, BLOCK C, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN EXCELLENT REALTY SDN. BHD.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/08/24/0041
TARIKH LAWATAN:	02 SEPTEMBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.53157, 101.044208**

Koordinat Akhir: **4.52983, 101.043552**






Jumlah Jarak: 313 meter


RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Lahat Sri Wang 21	MBI	124 m
2.	Lahat Sri Wang 27	MBI	189 m
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			313 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	313	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		313	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	313	0.6	1.5	281.7
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		313	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<p>1. Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 313-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> adalah TIADA HALANGAN.</p> <p>2. Kontraktor perlu memastikan korekan pada laluan berdekatan dengan <i>manhole</i> TM dibuat dengan baik supaya tidak mengganggu laluan kabel tersebut.</p>				

Disediakan:	Disemak:	Disahkan:
		
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 05/09/2024	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 05/09/2024	Nama: Ir. Ahmad Afiq Bin Abu Kasim Jawatan: Jurutera Profesional No Sijil: 2422-010000-C121544 Tarikh: 05/09/2024



GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DARI PE DESA LAHAT DI JALAN SRI WANG 21



LALUAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN SRI WANG 21




LALUAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN SRI WANG 21



LALUAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN SRI WANG 27



KONTRAKTOR PERLU MEMASTIKAN KOREKAN PADA LALUAN BERDEKATAN DENGAN *MANHOLE* TM DAN KUMBAHAN DI JALAN SRI WANG 27 DIBUAT DENGAN BAIK SUPAYA TIDAK MENGGANGGU LALUAN KABEL TERSEBUT.

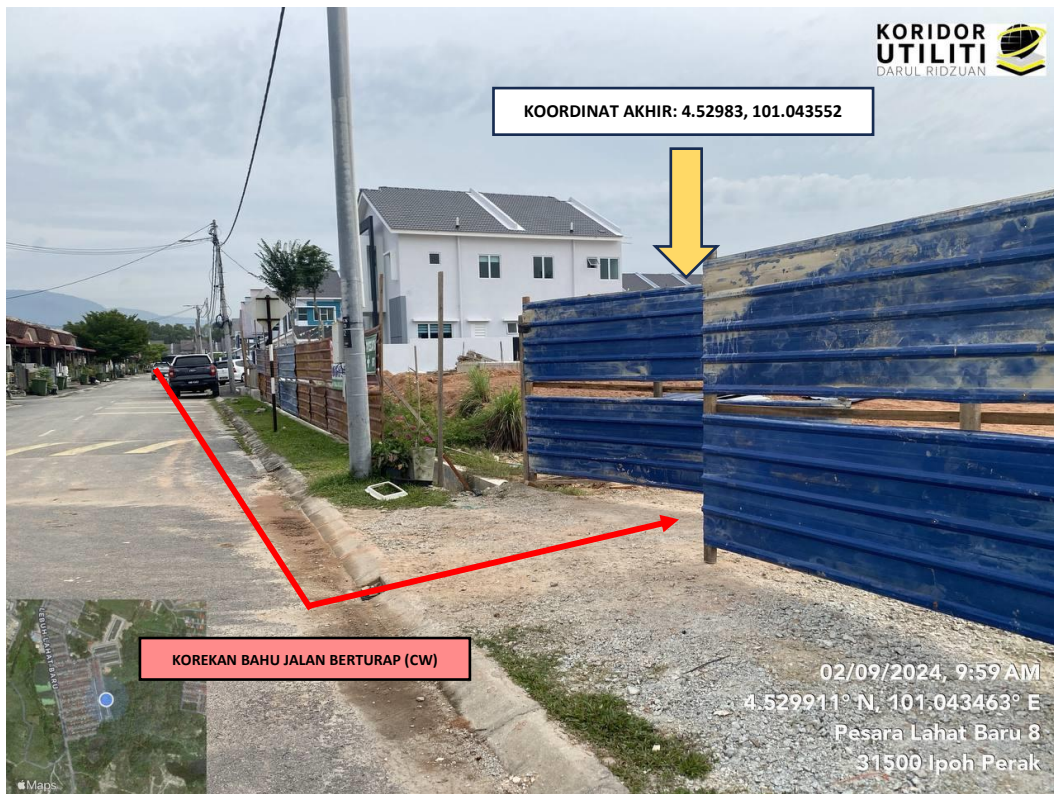

LOKASI KOORDINAT AKHIR BAGI KOREKAN TERBUKA DI HADAPAN KAWASAN MASUK TAPAK PEMBINAAN DAN AKAN DISAMBUNGKAN TERUS KE IPO 5453
