

TAJUK PROJEK:

EPCC OF NGDS TO KINTA VALLEY FL DL STAGE 1/24, BEMBAN INDUSTRIAL ESTATE & CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN. (WEI DAT STEEL WIRE SDN BHD - EXPANSION & BNH MANUFACTURER SDN BHD (PLAN T2))

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/GMDSB/A/08/24/0026
TARIKH LAWATAN:	14 OGOS 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.697812, 101.097229**

Koordinat Akhir: **4.692964, 101.098047**

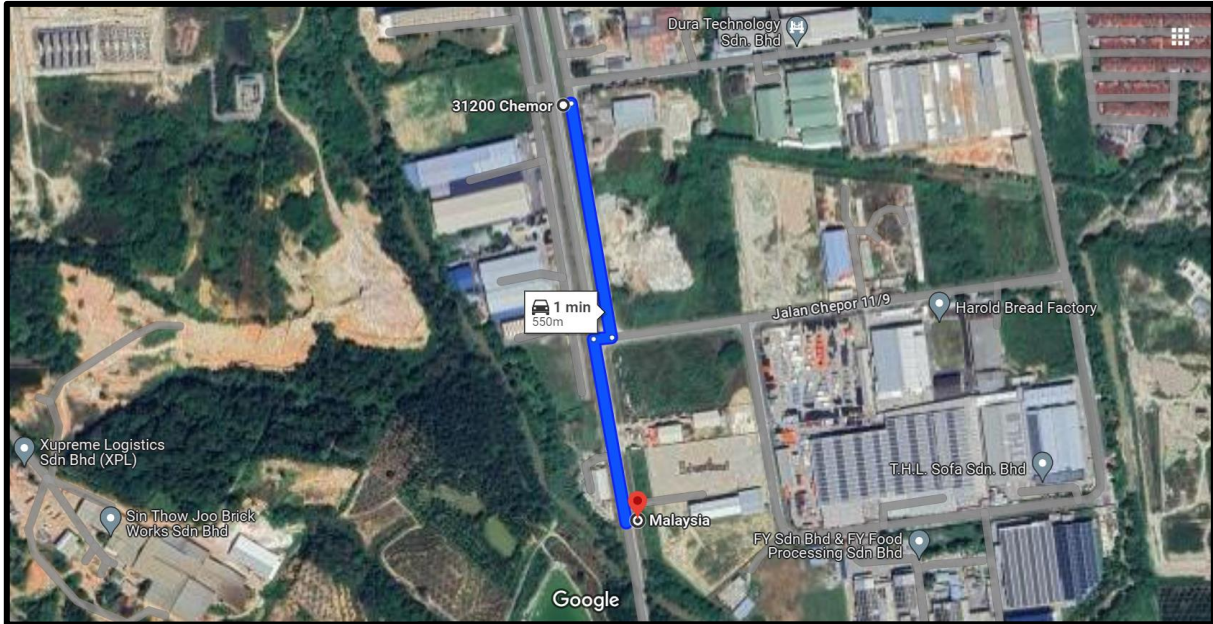




Jumlah Jarak: 544 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Jalan Seramik Chepor 11/1	MBI	544 m
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			544 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	40	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)	504	1.5	Meter	
Jumlah Jarak :		544	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	40	1.0	1.5	60
Grass Verge Way Open Cut Trenching	504	1.0	1.5	756
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		544	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 544-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> dan <i>Open Cut Trenching (Grass Verge Way)</i> adalah TIADA HALANGAN .				

Disediakan:	Disemak:	Disahkan:
		
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 20/08/2024	Nama: Kamarul Azlan Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 20/08/2024	Nama: Ir. Ahmad Afiq Bin Abu Kasim Jawatan: Jurutera Profesional No Sijil: 2422-010000-C121544 Tarikh: 20/08/2024


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

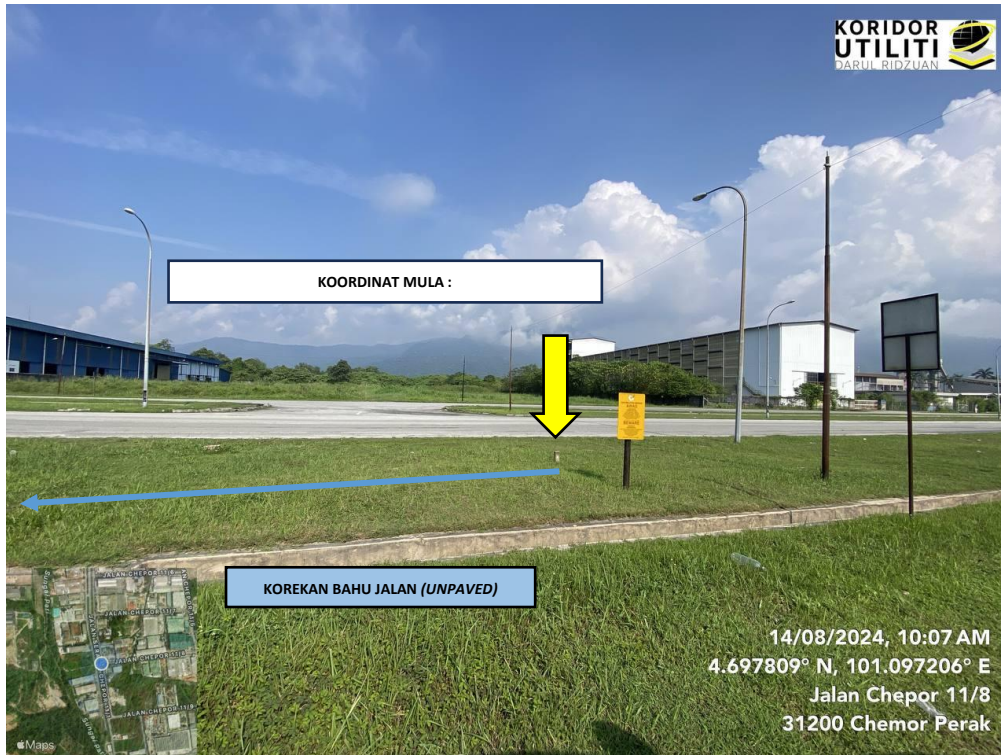


LOKASI MULA DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1



LOKASI KOREKAN GV DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1

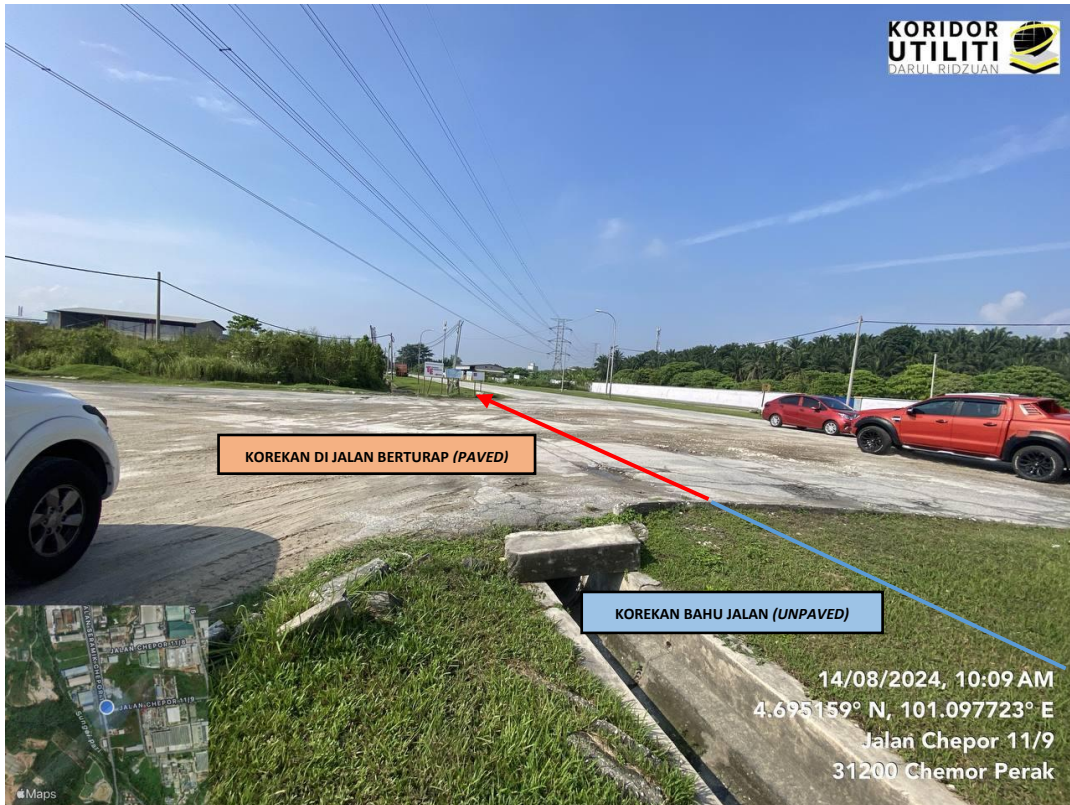

LOKASI KOREKAN GV DAN CW DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1

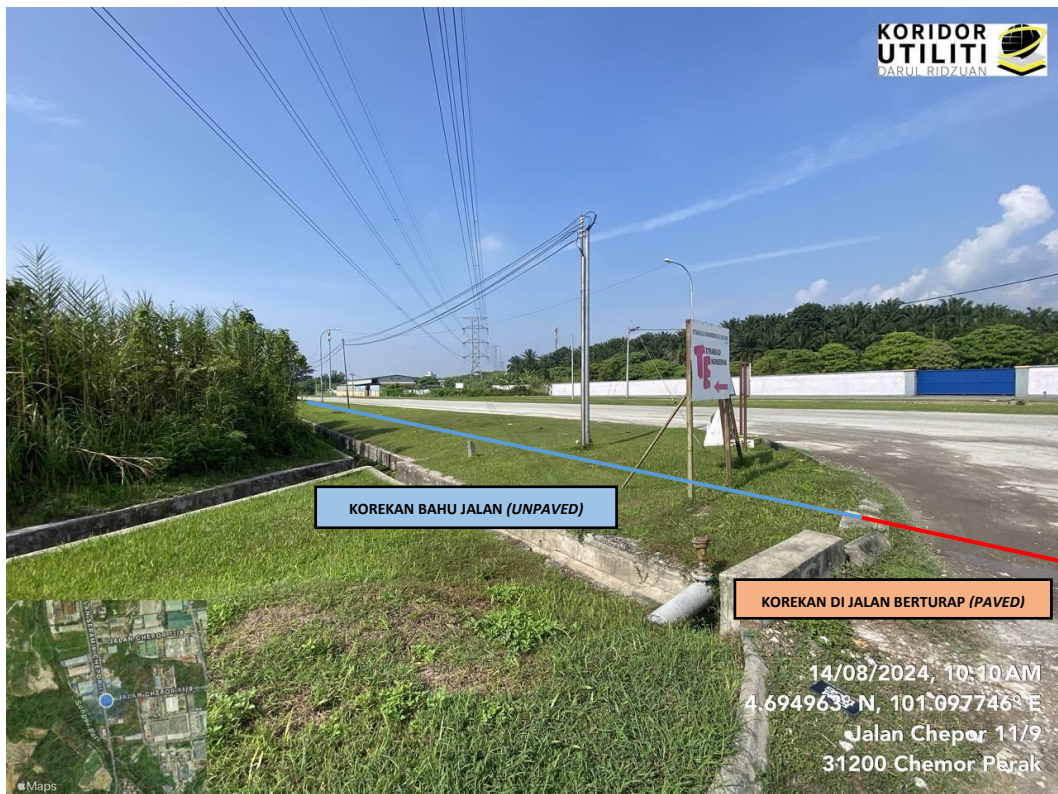

LOKASI KOREKAN GV DAN CW DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1



LOKASI KOREKAN GV DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1




LOKASI KOREKAN GV DAN CW DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1



LOKASI KOREKAN CW DAN GV DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1



LOKASI KOREKAN GV DAN CW DI JALAN SERAMIK CHEPOR 11/1

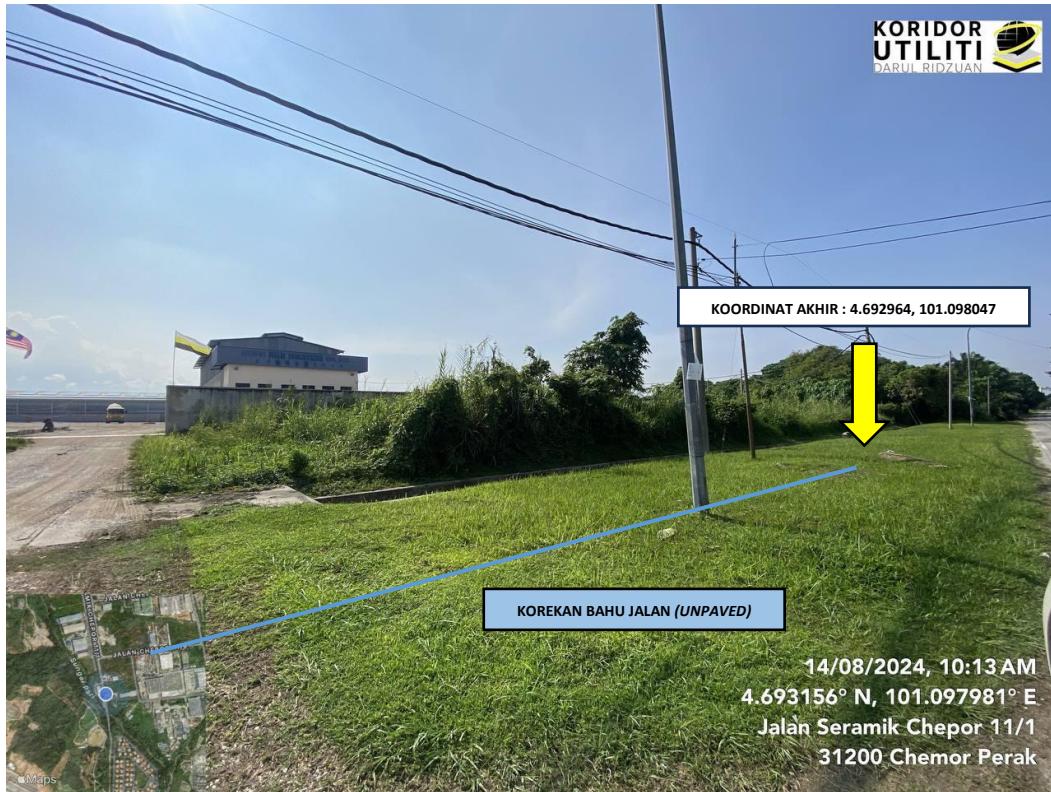

LOKASI KOORDINAT AKHIR
