

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH LADANG SOLAR BERKAPASITI 29.99 MW SELUAS 119.997 EKAR (48.561 HEKTAR) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 7380 (GRN:47836) DAN SEBAHAGIAN LOT 7519 (GRN:47709) MUKIM DURIAN SEBATANG, DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN NEFIN V POWER SDN BHD.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/UNK/A/10/25/0880
TARIKH LAWATAN:	12/11/2025
DISEDIAKAN OLEH:	MOHD DANIAL BIN MOHD ADNAN

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 3.976688,101.092405
 Koordinat Mula: 3.975882,101.093793
 Koordinat Akhir: 3.985964,101.070793
 Koordinat Akhir: 3.977203,101.091961

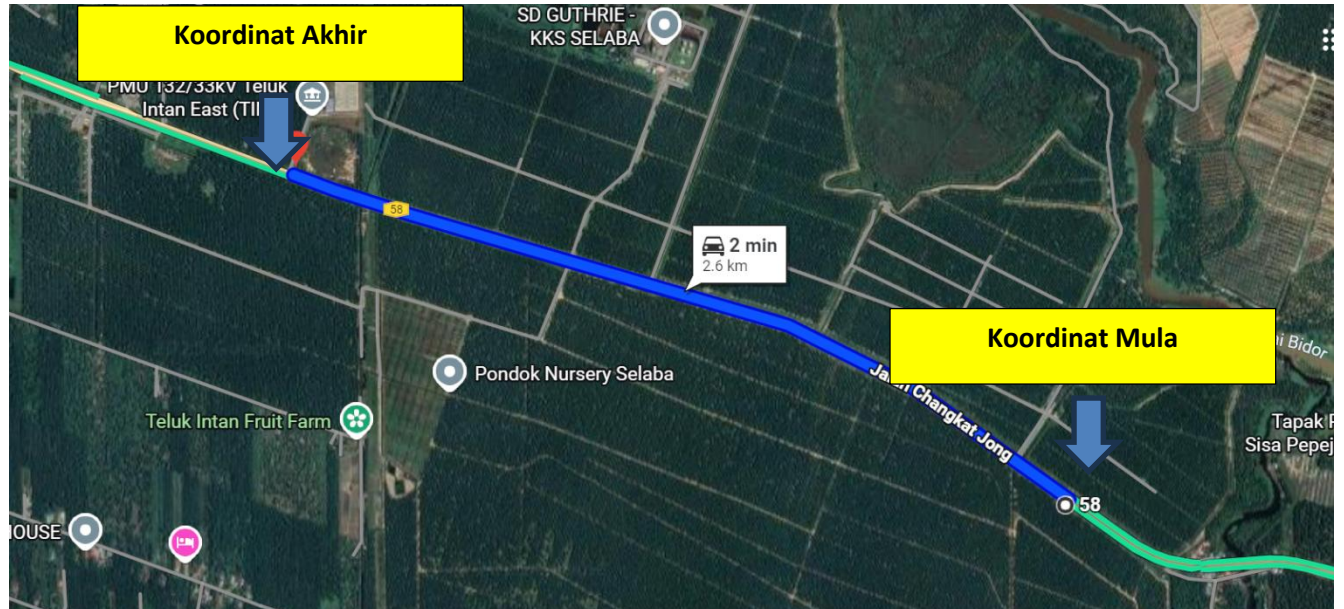



Jumlah Jarak: 2,926 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (METER)
1.	JALAN TELUK INTAN – BIDOR FT058	JKR HILIR PERAK	2,866 METER
2.	PARIT DI JALAN TELUK INTAN – BIDOR FT058	JPS HILIR PERAK	60 METER
Jumlah Jarak:			2,926 METER

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)	2,676	11	Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)	250	1.5	Meter	
Penanaman Tiang			Meter	
Jumlah Jarak :		2,926	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD		7	Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Penanaman Tiang			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD	1	1	4	
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR HILIR PERAK		2,866	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)	JPS HILIR PERAK		60	Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian	PERSENDIRIAN		228	Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak bersama pihak JKR Hilir Perak & Gas Malaysia pada 08/12/2025 mendapati bahawa kerja- kerja pemasangan utiliti menggunakan kaedah HDD & GV yang melibatkan jarak keseluruhan sepanjang 2,926 meter. 2. Hasil perbincangan di tapak, pihak Gas Malaysia membenarkan kerja pengalihan tiang & diganti dengan kerja korekan terbuka (GV) dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> I. Kerja korekan terbuka mestilah dilakukan dengan jarak 1 meter dari paip gas cadangan. 3. Notis mula kerja perlu dilampirkan kepada KUDR disebabkan jajaran ini juga bertindih dengan kerja-kerja daripada ALLO Tecnology (RUJ: KUDR/ALLO/A/09/25/0824) 				

Disediakan:	Disemak:
	
<p>Nama: Mohd Danial Bin Mohd Adnan Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 12/11/2025</p>	<p>Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 12/11/2025</p>

Gambar di tapak projek:



