

TAJUK PROJEK:

SEBUT HARGA KERJA MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PAIP JENIS UPVC PN 12 BERUKURAN 155MM Ø BAGI MENGGANTIKAN PAIP 100MM Ø AC YANG KERAP BOCOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TOKONG, JELAPANG, PERAK BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) MINGGU.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/LAP/B/04/25/0343
TARIKH LAWATAN:	18 APRIL 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.632955,101.062271
 Koordinat Akhir: 4.633457,101.060453
 : 4.63329,101.05844

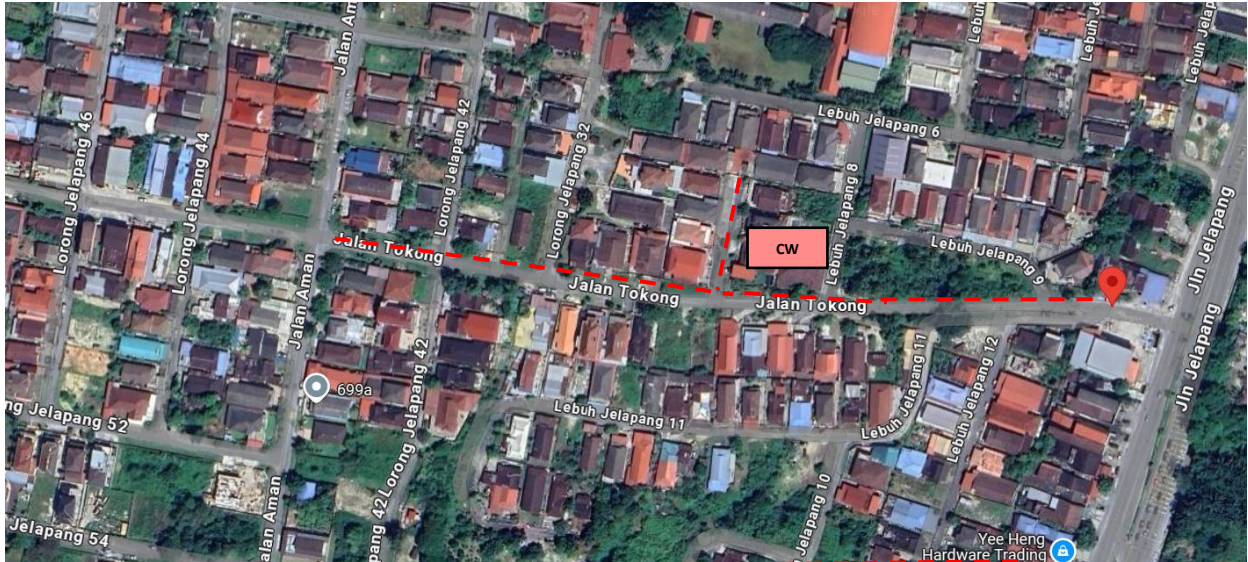

Jumlah Jarak: 480 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN TOKONG	MBI	480 meter
2.	LEBUH JELAPANG 7		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			480 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	480	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		480	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	480	0.6	1.5	432
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		480	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 18.04.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 480-meter menggunakan kaedah Open Cut Trenching (Carriage Way). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak MBI akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
Nama: MUHAMAD HARRITH BIN MUHTAR Jawatan: penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 18/04/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 18/04/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-




LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN TOKONG



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN TOKONG



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN TOKONG

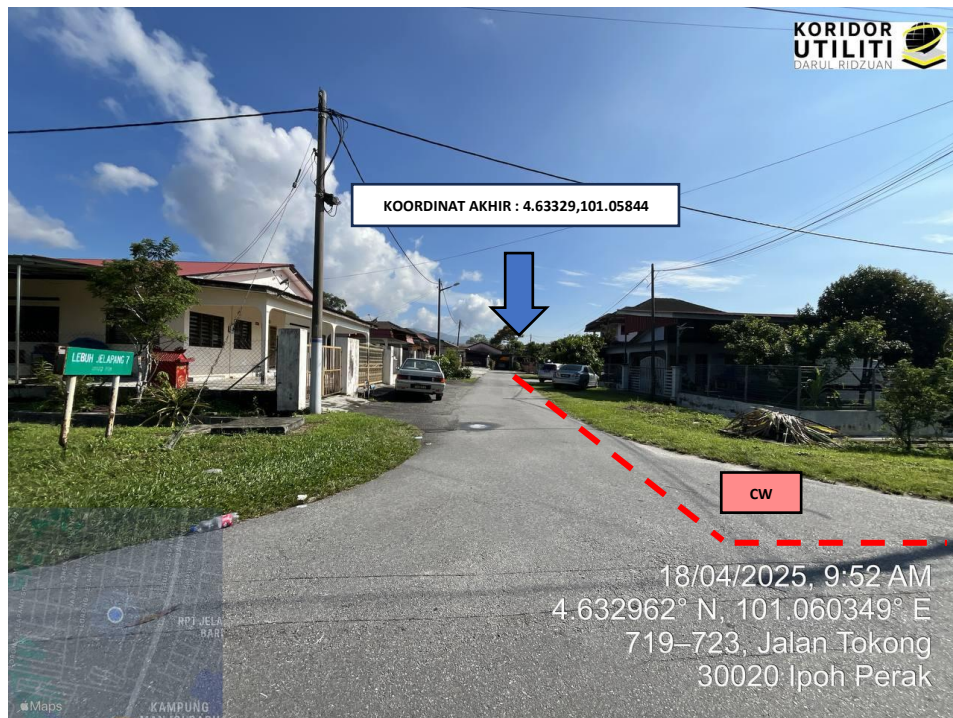

JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI LEBUH JELAPANG 7



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN TOKONG



LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI JALAN TOKONG
