

TAJUK PROJEK:

MENJALANKAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF KABEL FIBER OPTIK TM UNTUK PROJEK
191000005832 _RWOA CWS TM HDPN PROTON CITY TANJUNG MALIM
(A3A112506009)

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TMBS/A/07/26/0299
TARIKH LAWATAN:	10 OGOS 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **3.746440,101.499325**

Koordinat Akhir: **3.741614,101.503184**

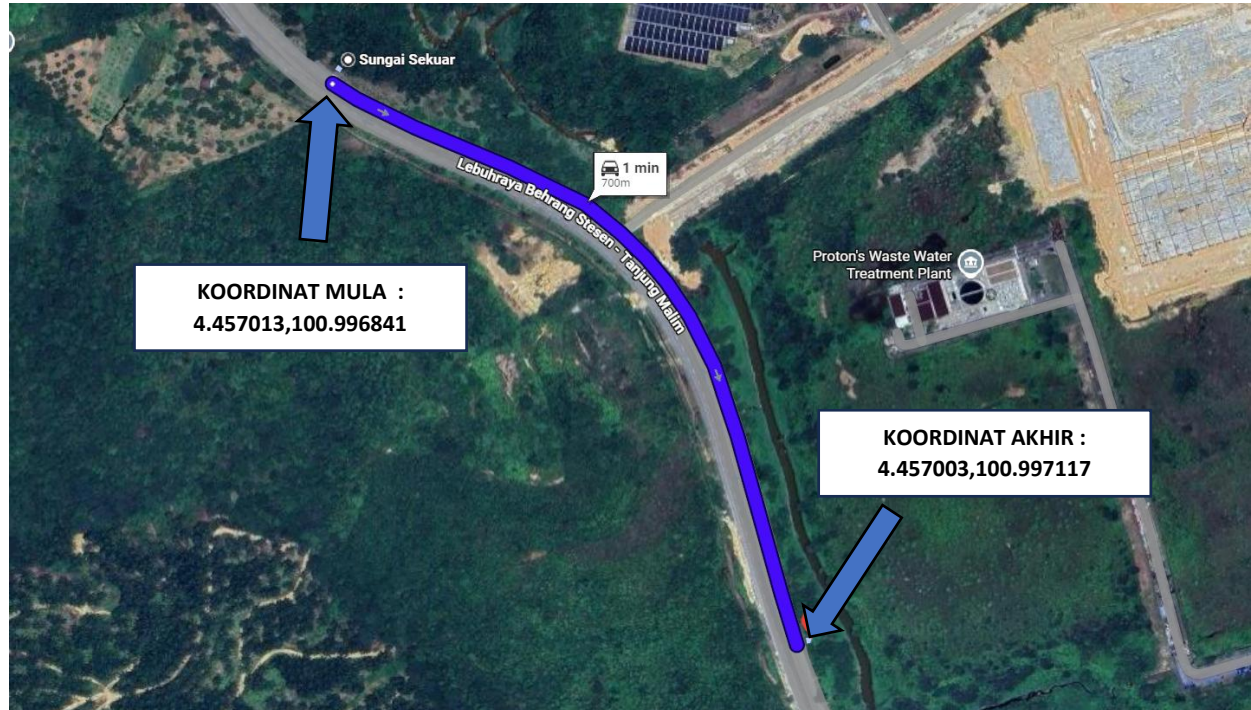

Jumlah Jarak : 725 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)	JKR	725
2.			
3.			
Jumlah Jarak:			725 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		725	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter
Jumlah Jarak :			725	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Manhole			5	Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Cadangan Manhole	1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole	JRC 7		5	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR DAERAH MUALIM		725	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 10.08.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 725-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) merentangi di Jalan Behrang–Tanjung Malim (Ft193). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 10/08/2026	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 10/08/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

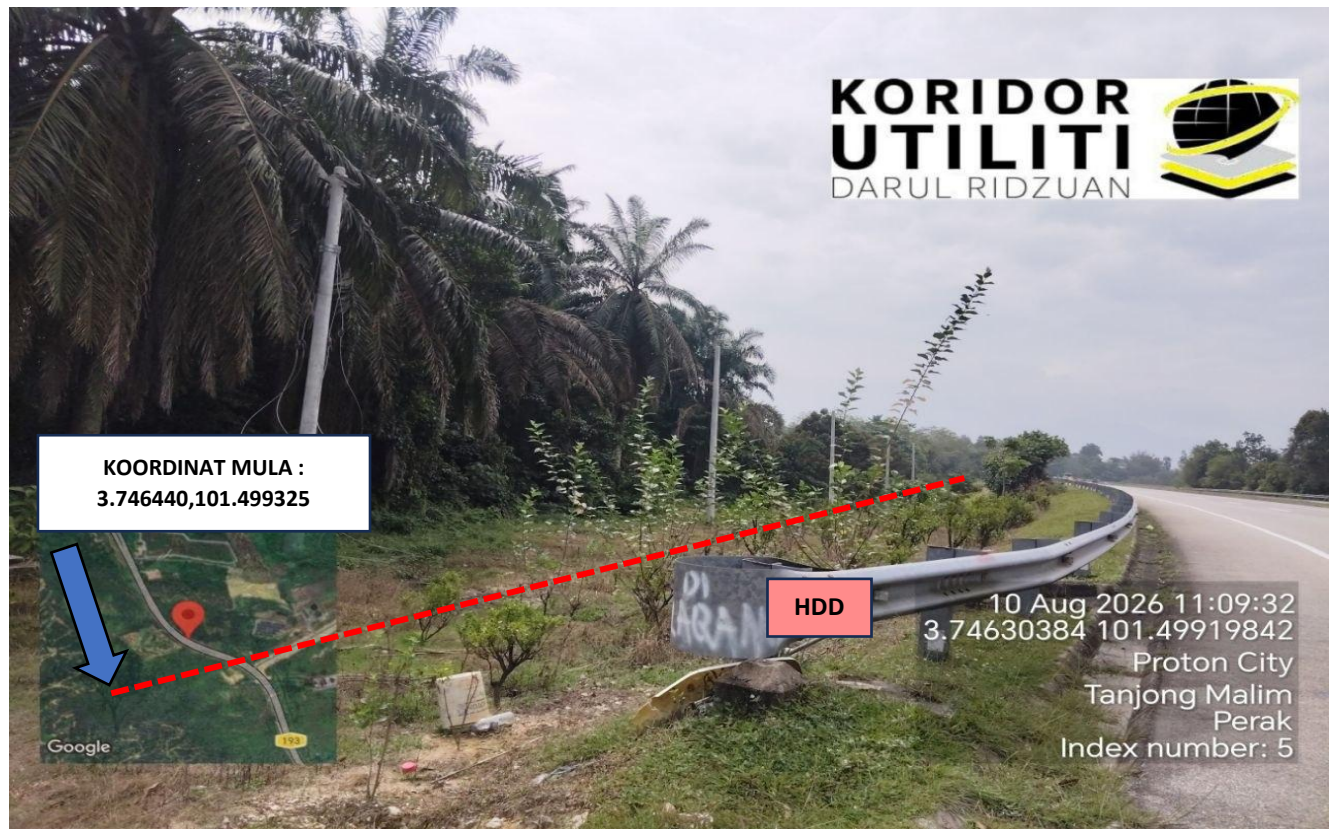

LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA-KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)

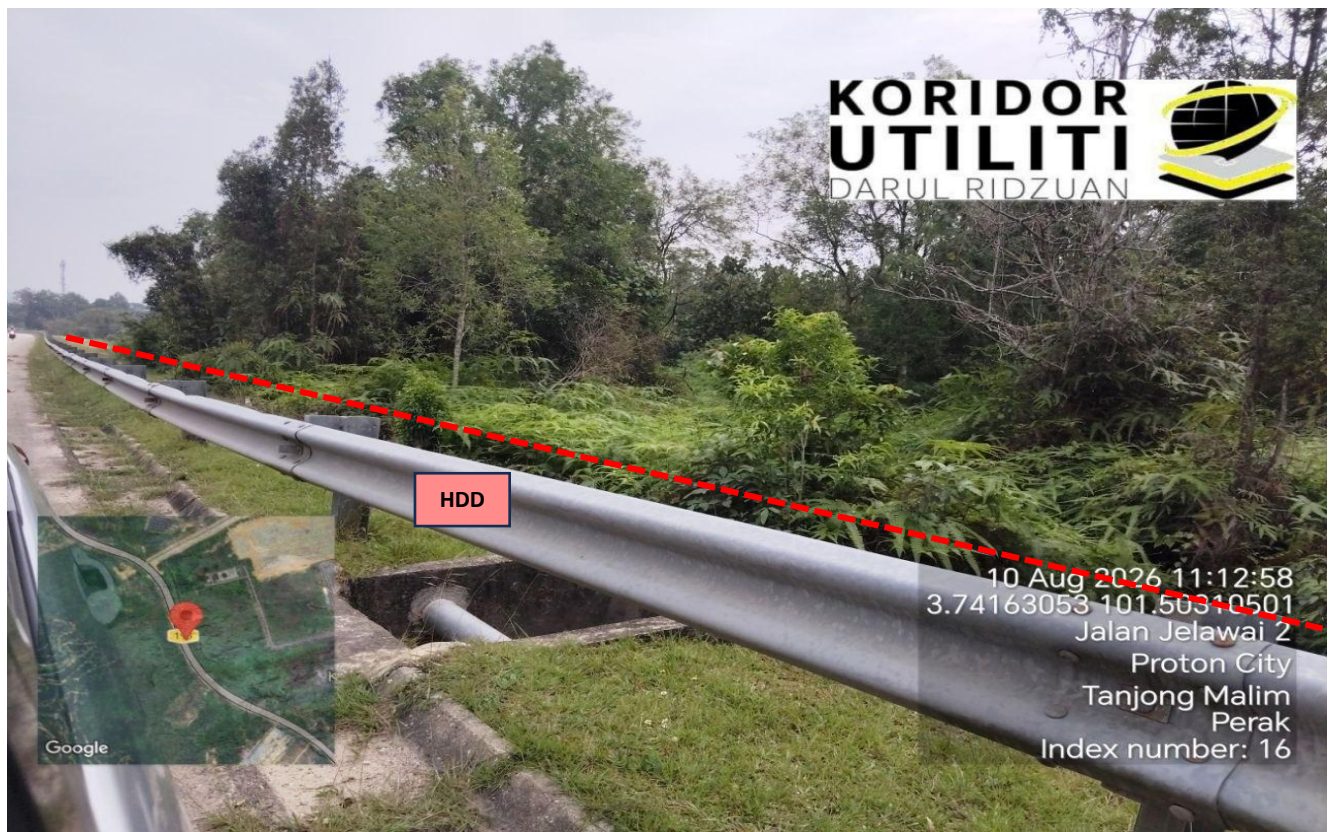

LOKASI KERJA KOREKAN HDD CROSSING DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BEHRANG–TANJUNG MALIM (FT193)



LAWATAN TAPAK BERSAMA PJ JKR MUALIM DAN PIHAK PEMOHON
