

TAJUK PROJEK:

CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN DARI 300A KE 1200A BAGI LOT 316719, LENGKOK RISHAH 2, KAWASAN PERINDUSTRIAN SILIBIN, 30100 IPOH, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN POLYPARTS SDN. BHD.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/12/25/0976
TARIKH LAWATAN:	23 DISEMBER 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.611523,101.05086**

Koordinat Akhir: **4.611432,101.050804**

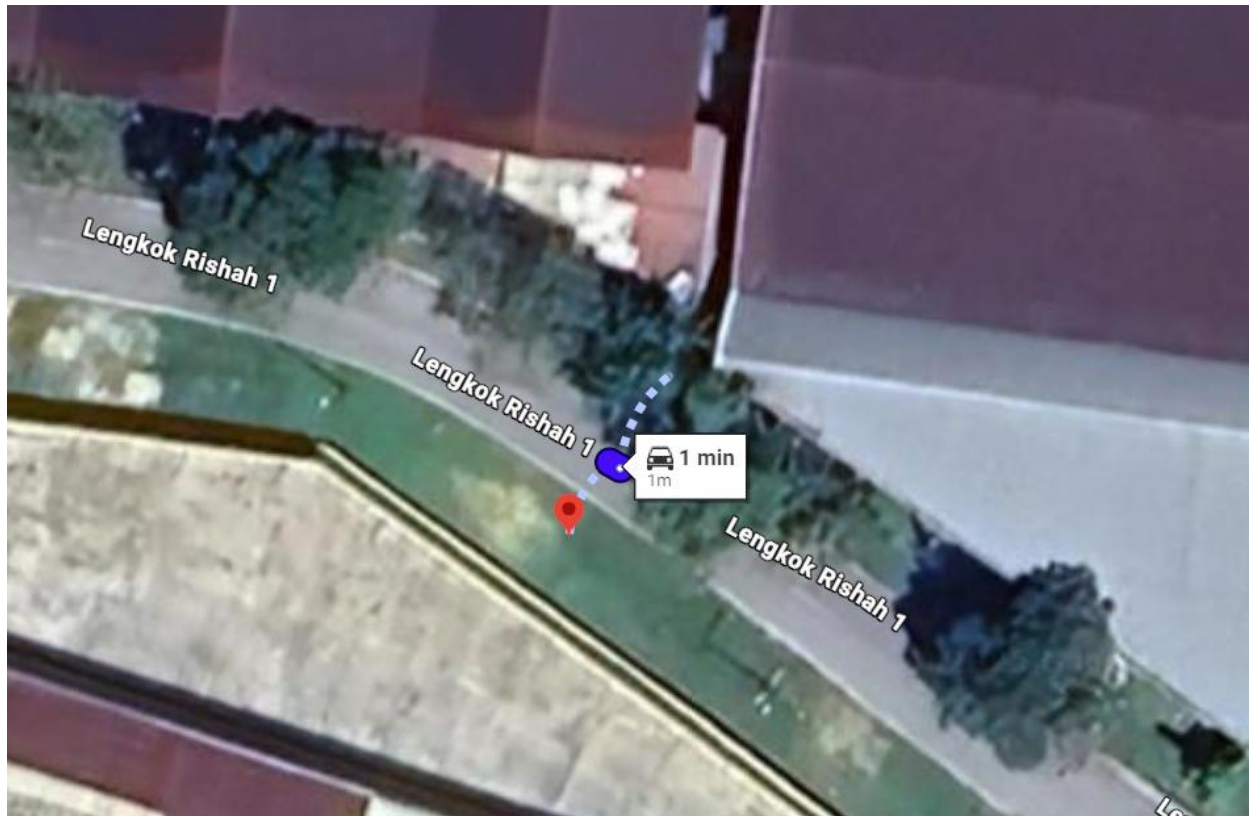



Jumlah Jarak : 12 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	LENGKOK RISHAH 1	MBI	12
2.			
3.			
4.			
4.			
Jumlah Jarak:			12 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)				Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)		12	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter	
Jumlah Jarak:			12	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos	
Cadangan Pit HDD				Nos	
Cadangan Manhole				Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)		Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching		12	0.6	1.5	10.8
Grass Verge Open Cut					
Cadangan Manhole HDD					
Cadangan Pit HDD					
Cadangan Detail Manhole		Jenis		Nos	
Manhole					
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa		Pihak Berkuasa	Jarak	Unit, m	
Jabatan Kerja Raya (JKR)					
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)		MAJLIS BANDARAYA IPOH	12	Meter	
Pejabat Daerah (PD)					
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)					
Lain-Lain / Tanah Persendirian					
Nota Tambahan: -					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 23.12.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 12-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i>. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 					

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 23/12/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 23/12/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-

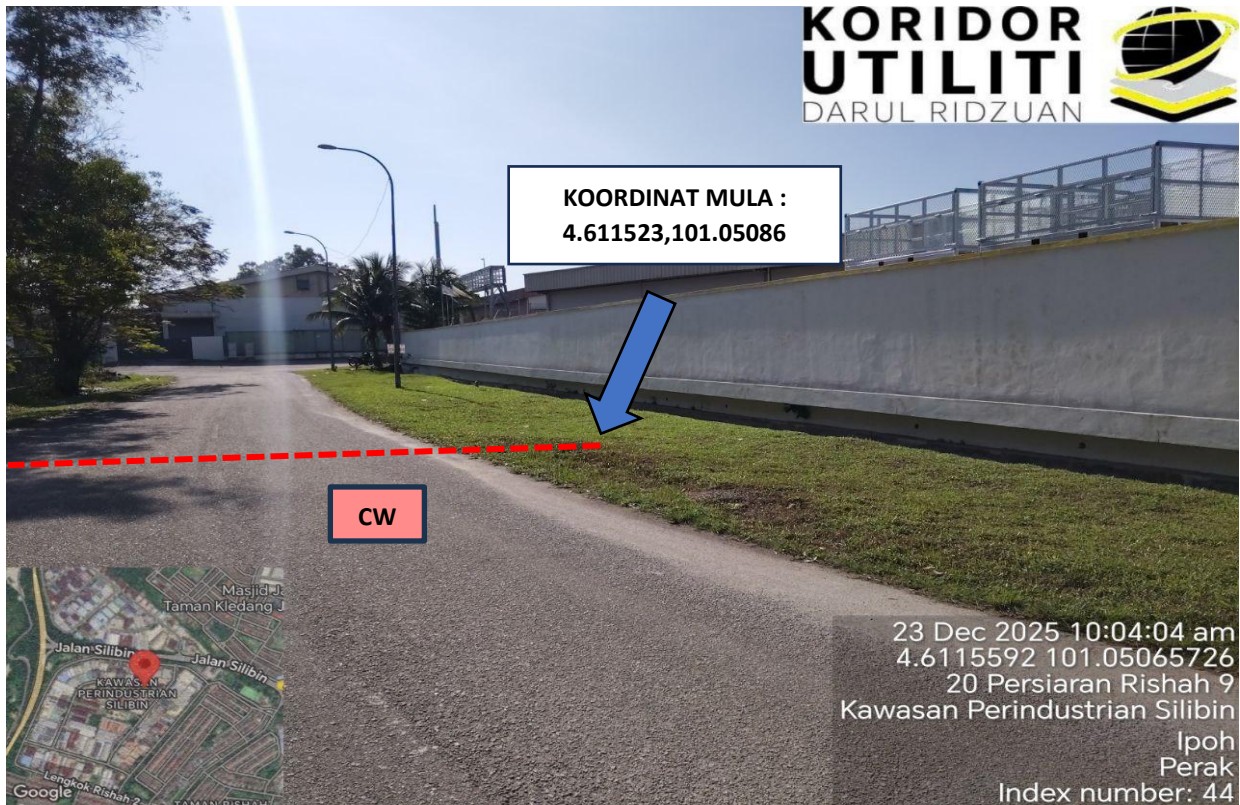

LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN TERBUKA DI LENGKOK RISHAH 1

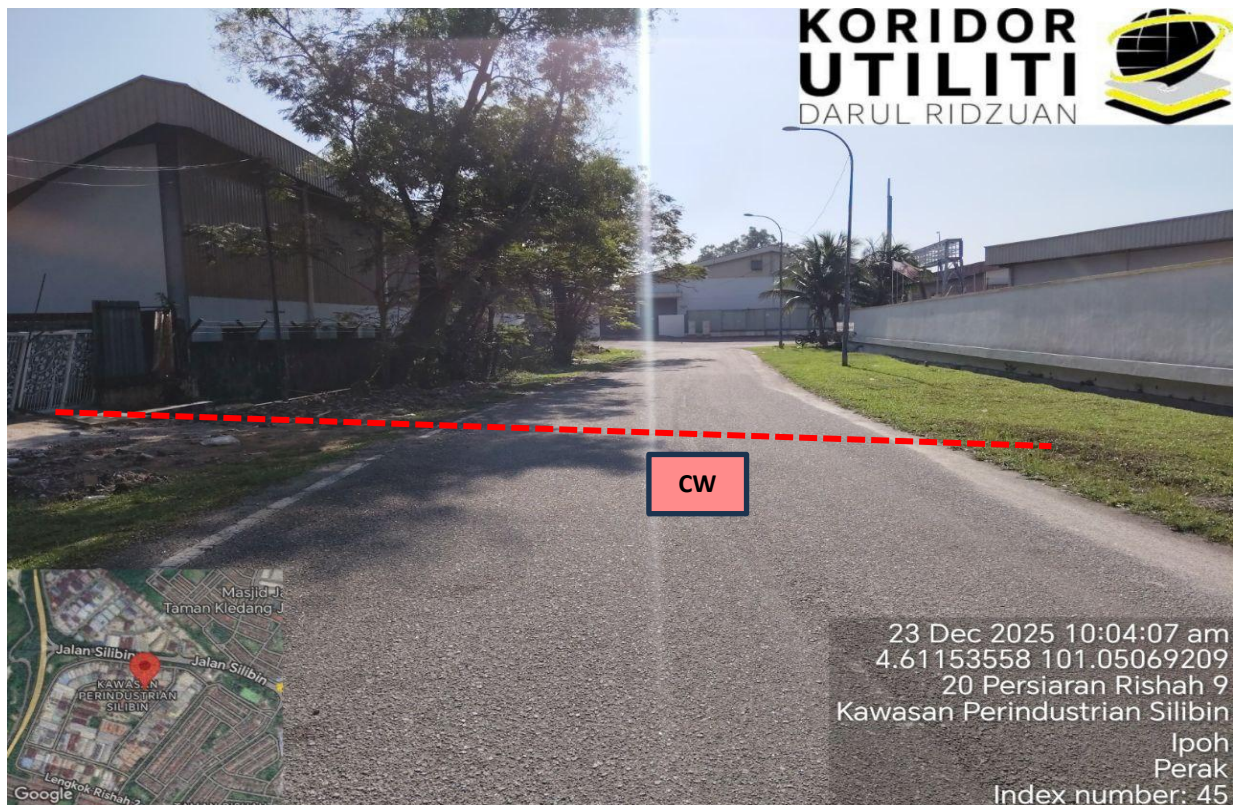

LOKASI KERJA KOREKAN TERBUKA DI LENGKOK RISHAH 1



LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA KOREKAN TERBUKA DI LENGKOK RISHAH 1
