

TAJUK PROJEK:

MSVT MENUKAR KVT PILC YANG SERING MENGALAMI GANGGUAN BEKALAN KEPADA KVT 240MMP
DI ANTARA PE IPOH CRISTIAN CHAPEL KE PE TAMAN TINGGI

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBS/A/02/25/0158
TARIKH LAWATAN:	20 FEBRUARI 2025
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.605349, 101.051598

Koordinat Akhir: 4.602609, 101.048638





Jumlah Jarak : 639 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN RAJA PEREMPUAN MAZWIN	MBI	435
2.	PERSIARAN RISHAH 32	MBI	188
3.	PERSIARAN RISHAH 13	MBI	16
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			639 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)	62	1.2	Meter
Pipe Jacking			Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)	577	1.2	Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter
Jumlah Jarak :		639	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos
Cadangan Manhole HDD			Nos
Cadangan Pit			3
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m
Carriage Way Open Cut Trenching			
Grass Verge Way Open Cut Trenching			
Cadangan Manhole HDD			
Cadangan Pit HDD	4.0	2.4	1.2
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos
Manhole			
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak
Jabatan Kerja Raya (JKR)			Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		639
Pejabat Daerah (PD)			Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)			Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian			Meter
Nota Tambahan: -			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 20.02.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 639-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> dan <i>Horizontal Directional Drilling (HDD)</i>. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, pihak MBI TIADA HALANGAN bagi permohonan ini. 			

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 21/02/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 21/02/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



**LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN RISHAH 13
(Sambungan akan dibuat pada PE Taman Tinggi)**



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN RISHAH 32




JAJARAN KERJA HDD DI PERSIARAN RISHAH 32




JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PEREMPUAN MAZWIM



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PEREMPUAN MAZWIM

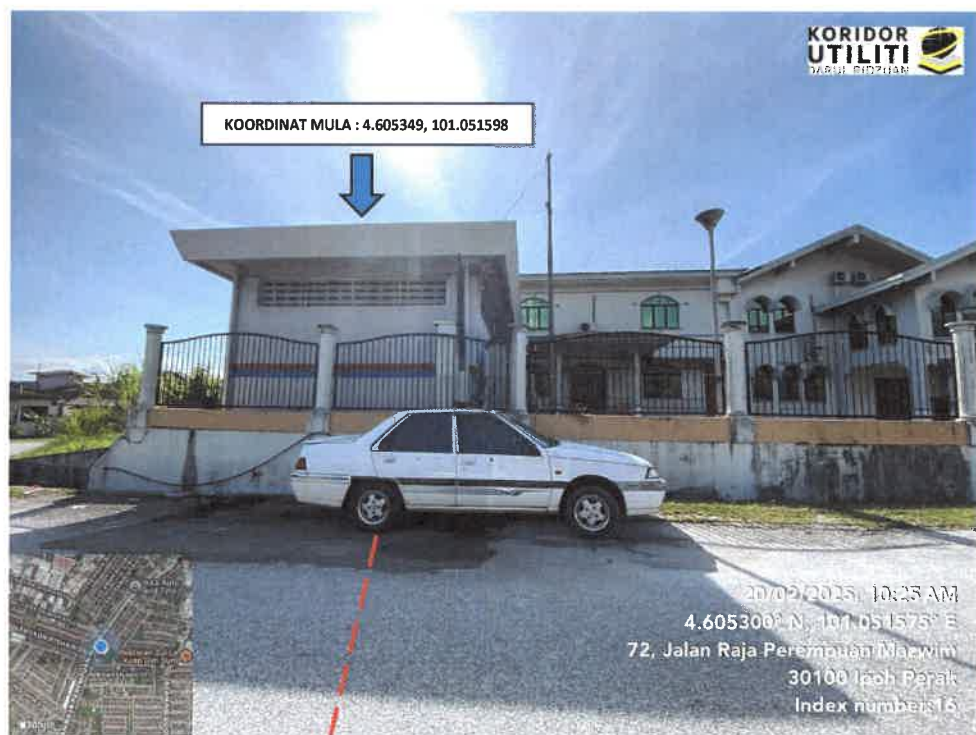

**LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN PEREMPUAN MAZWIM
(Sambungan akan dibuat pada PE Ipoh Christian Chapel)**

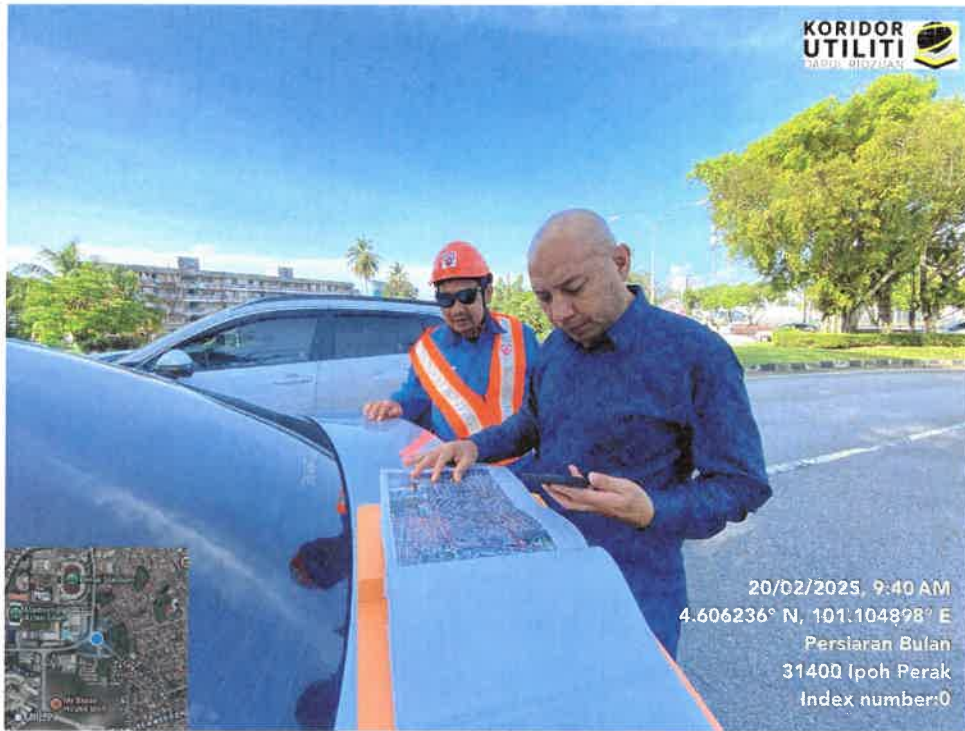

LAWATAN TAPAK AWALAN BERSAMA WAKIL MBI, WAKIL TNB DAN KONTRAKTOR
