

TAJUK PROJEK:

CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN REZAB JALAN AWAM DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD – SO DAMACAI A035 JALAN ALI PITCHAY, N’OSAIRIS TECHNOLOGY SOLUTION SDN BHD

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TTDC/B/06/26/0250
TARIKH LAWATAN:	30 JUNE 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.591313,101.084364**

Koordinat Akhir: **4.591509,101.085247**




Jumlah Jarak : 116 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN YANG KALSOM	MBI	116
3.	JALAN ALI PITCHAY		
4.			
4.			
Jumlah Jarak:			116 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		94	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Micro Trenching)		22	1.5	Meter
Jumlah Jarak:			116	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Manhole			1	Nos
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	22	0.3	1.5	9.9
Grass Verge Open Cut				
Cadangan Manhole HDD	1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole	JRC 7		1	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS BANDARAYA IPOH		116	Meter
Pejabat Daerah (PD)				
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				
Lain-Lain / Tanah Persendirian				
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 30.06.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 22-meter menggunakan kaedah Open-Cut Micro Trenching (MT) dan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) sepanjang 94-meter . 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 30/06/2026	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 30/06/2026


GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-

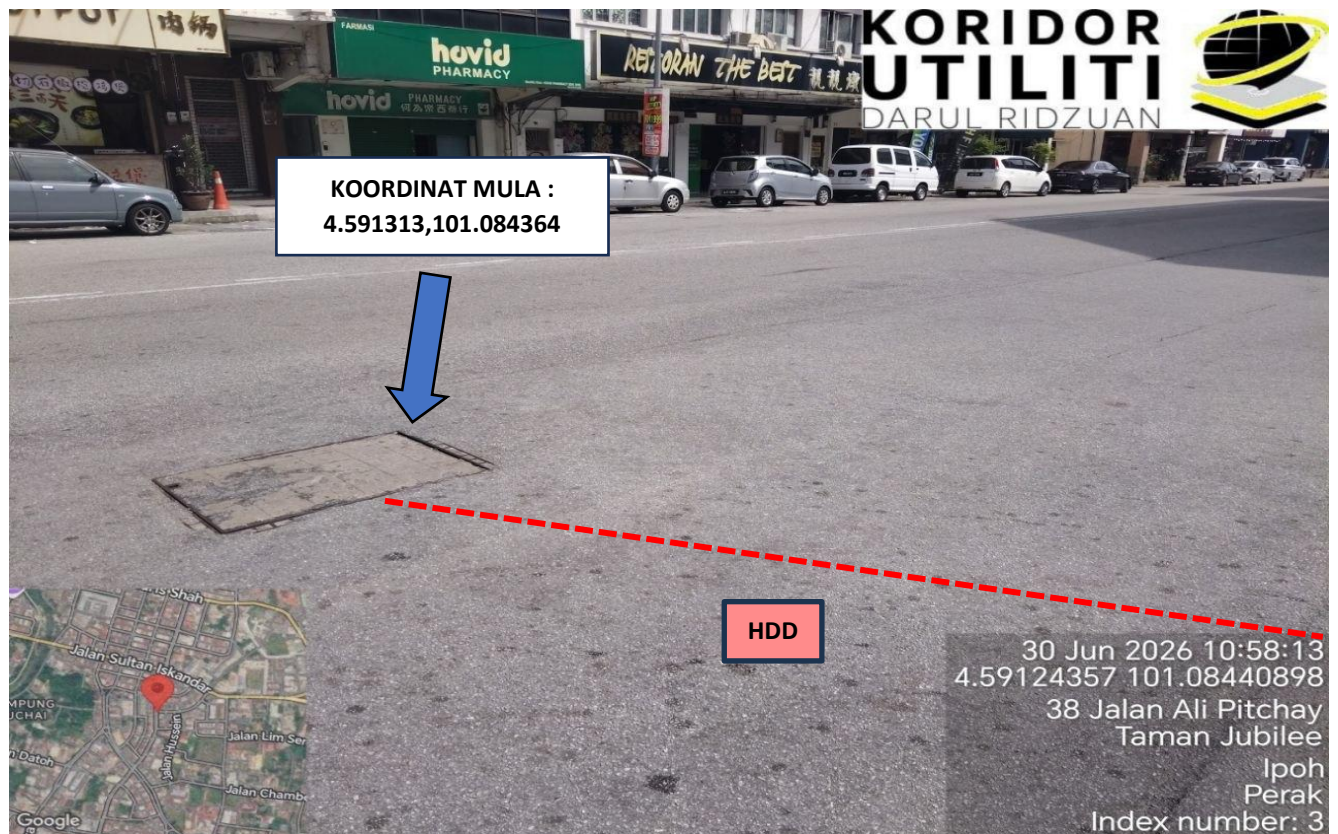


LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN HDD DI JALAN YANG KALSOM

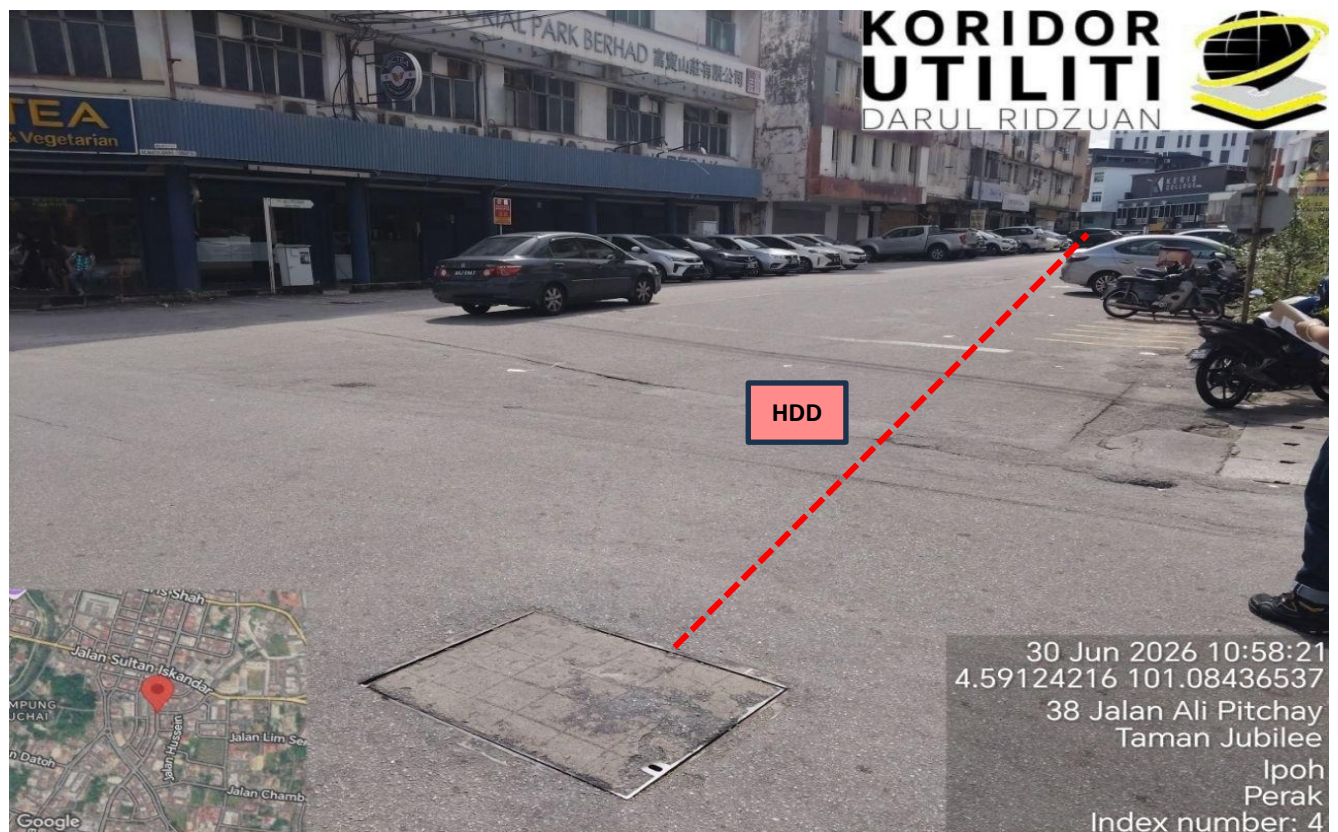


LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN YANG KALSOM

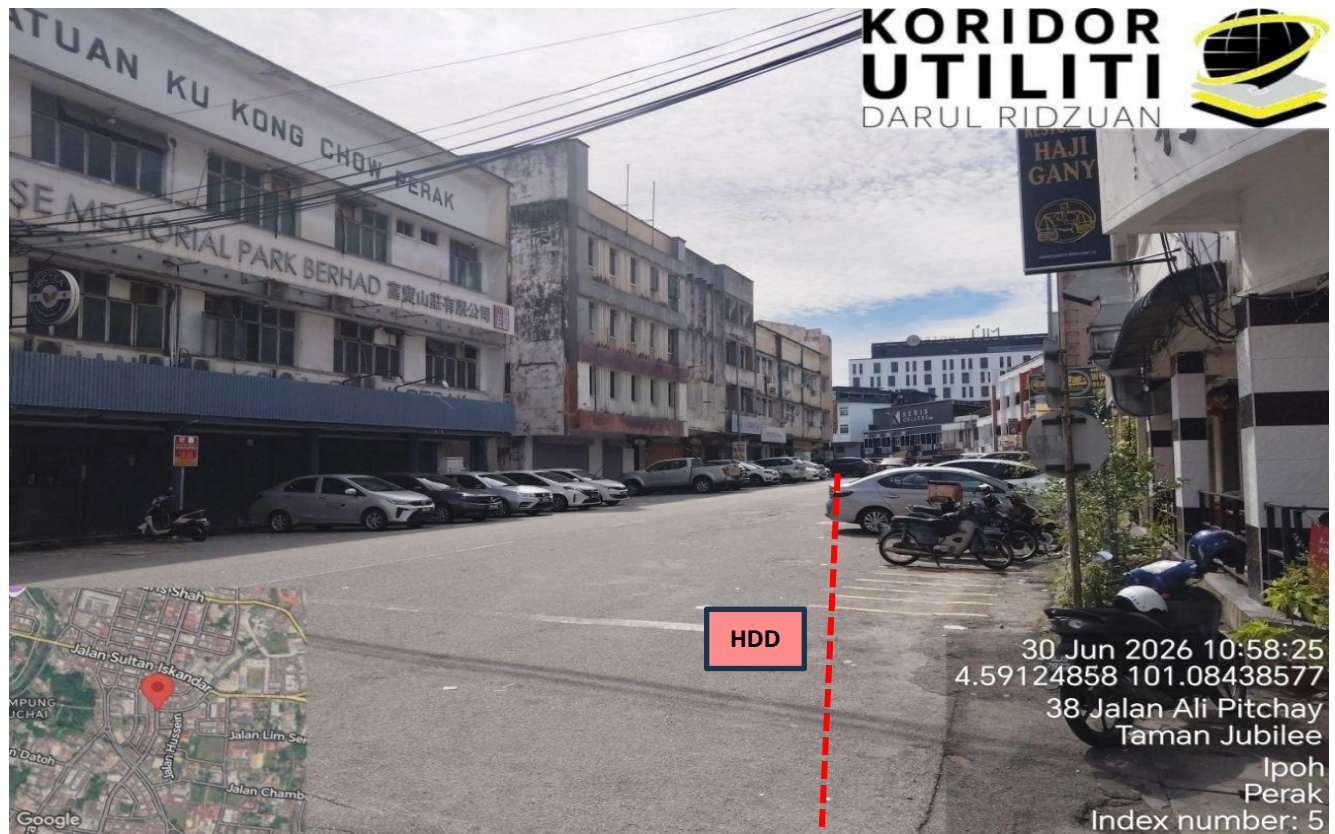


LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN ALI PITCHAY

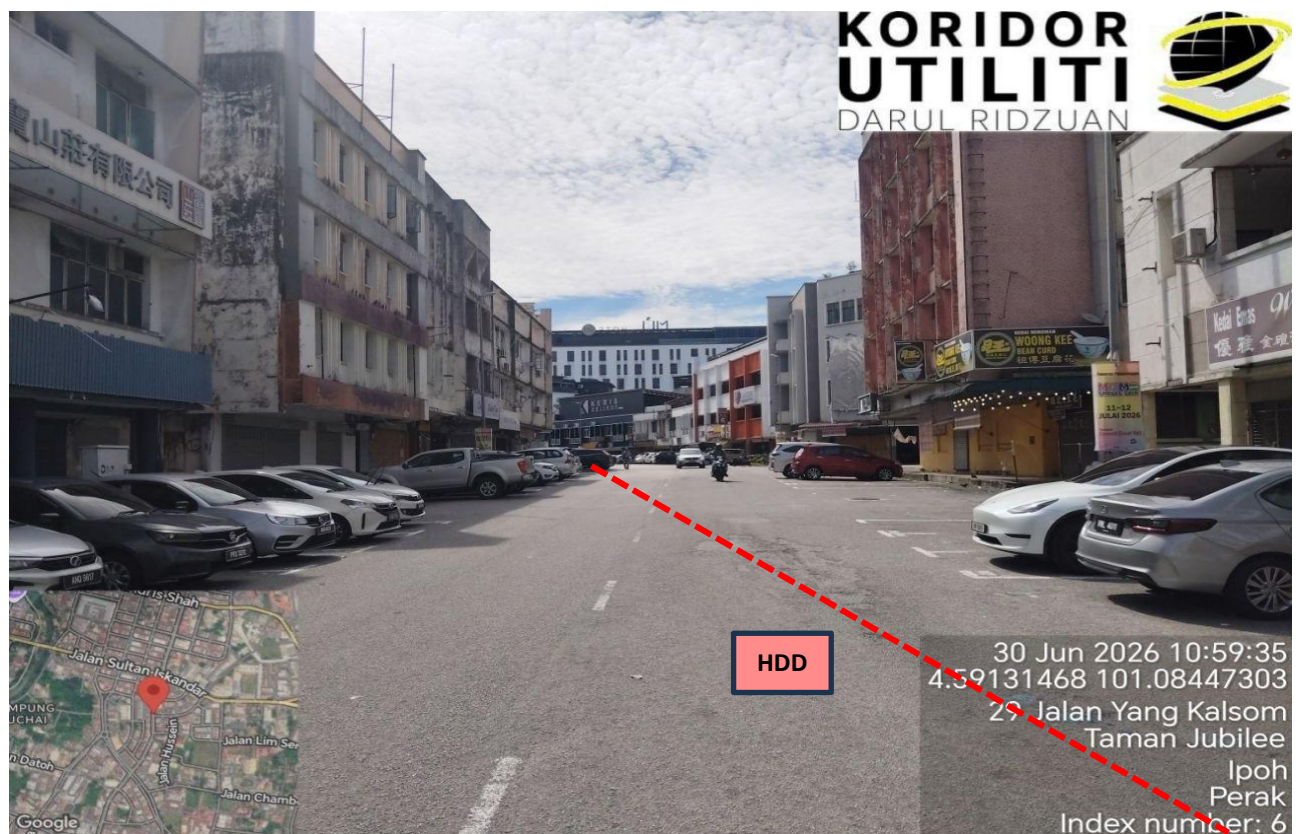


LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN ALI PITCHAY

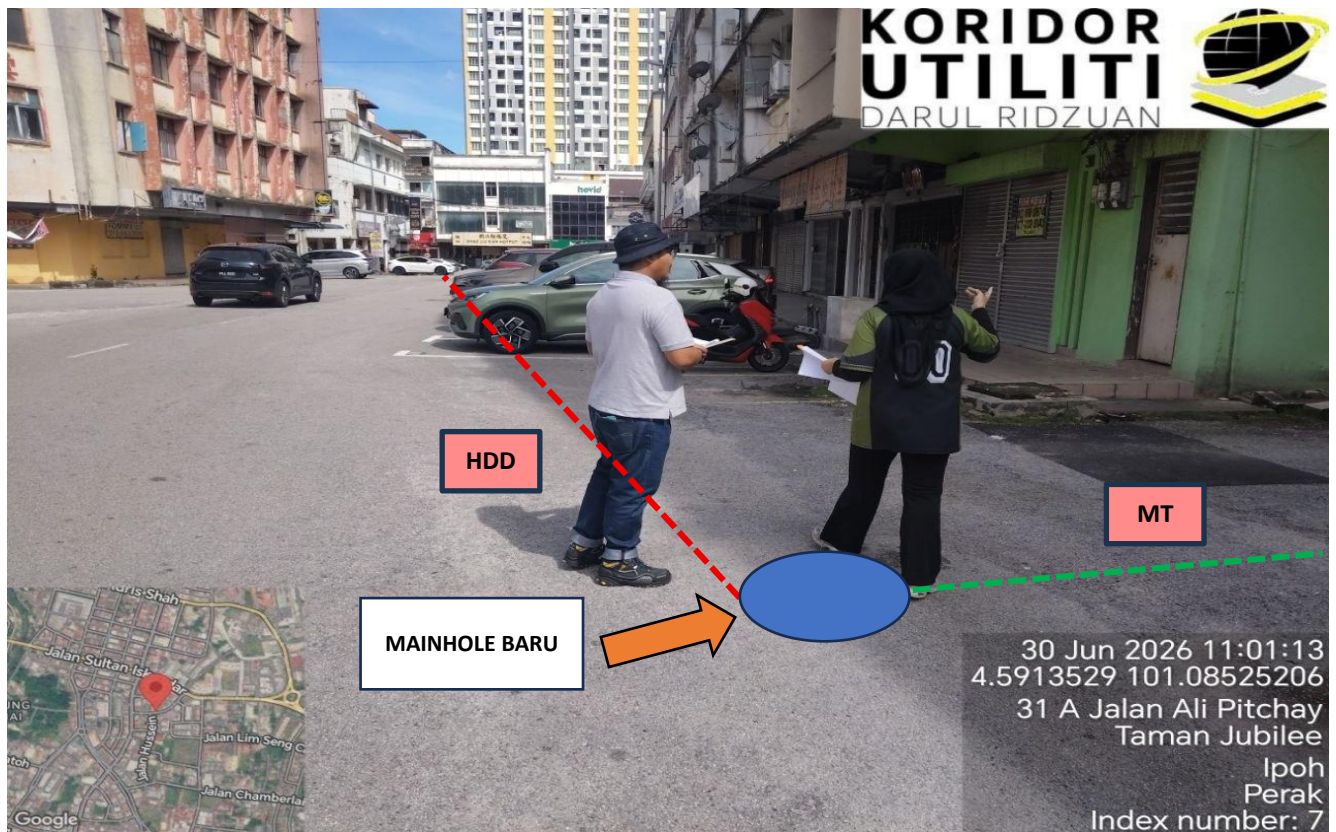

LOKASI KERJA KOREKAN HDD MANHOLE DI JALAN ALI PITCHAY

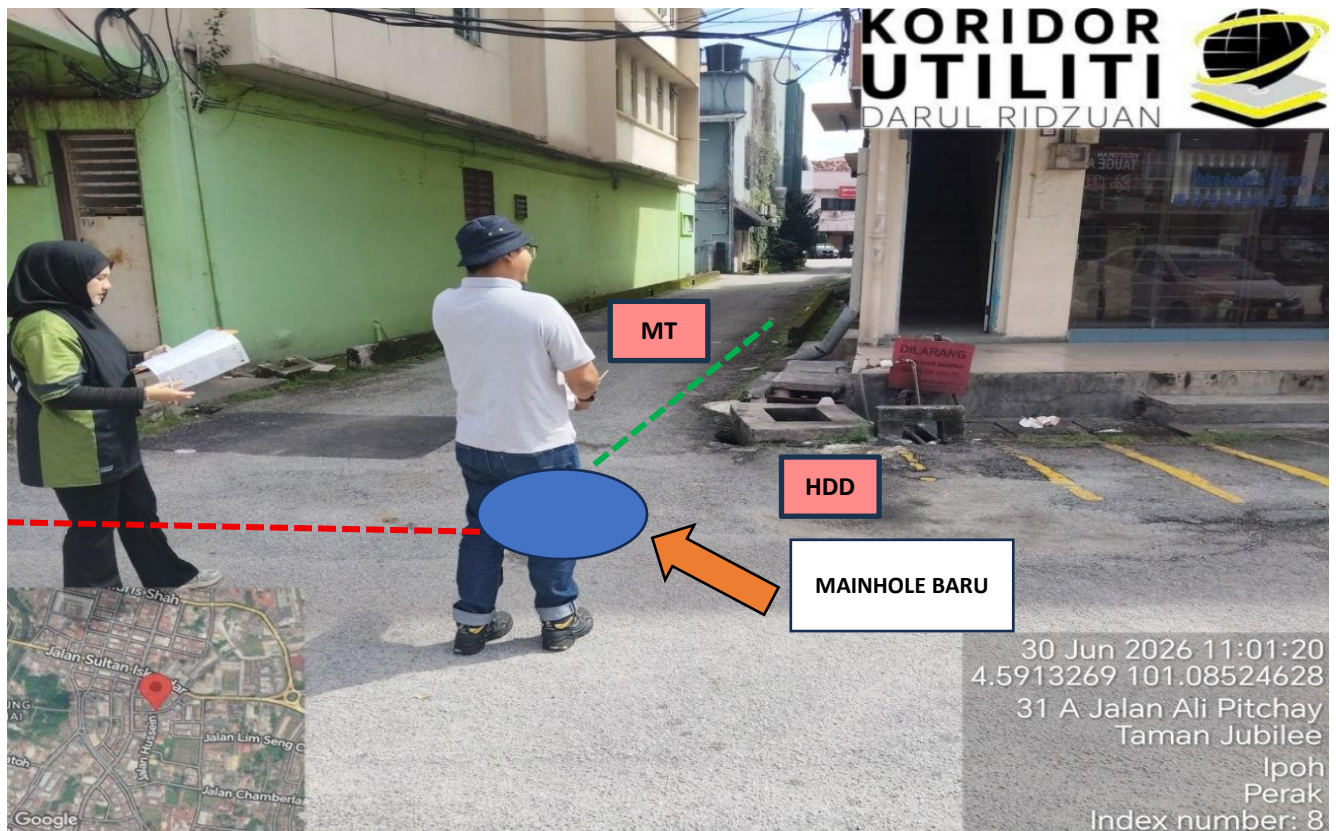

LOKASI KERJA KOREKAN HDD DAN KOREKAN TERBUKA MICRO TRENCHING DI JALAN ALI PITCHAY

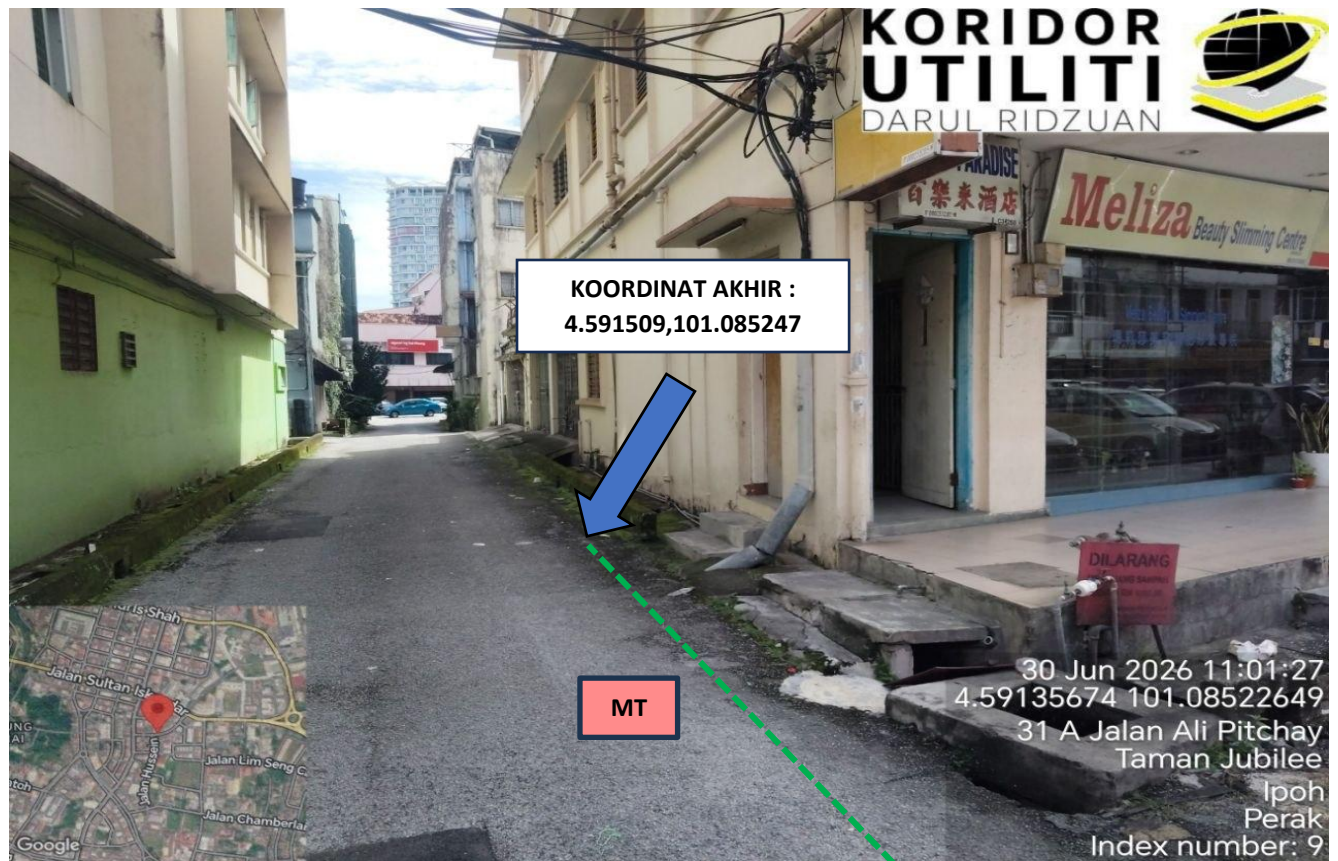

LOKASI KOORDINAT AKHIR KERJA KOREKAN TERBUKA MICRO TRENCHING DI JALAN ALI PITCHAY
(LORONG TENGAH)
