

TAJUK PROJEK:

CADANGAN PEMASANGAN UTILITI BAGI KABEL TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN RIZAB JALAN AWAM DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD – SO DAMACAI PIKE STREET, N'OSAIRIS TECHNOLOGY SOLUTION SDN BHD

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TTDC/B/07/26/0285
TARIKH LAWATAN:	23 JULY 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.565051,101.047477**

Koordinat Akhir: **4.566262,101.045766**




Jumlah Jarak : 250 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN LEE MING HIN (LORONG TENGAH)	MBI	250
2.	JALAN BESAR (LORONG TENGAH)		
3.	JALAN TRANCHELL (LORONG TENGAH)		
4.			
Jumlah Jarak:			250 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)		250	4	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Micro Trenching)				Meter
Jumlah Jarak:			250	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Manhole			1	Nos
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Open Cut				
Cadangan Manhole HDD	1.2	0.9	0.9	0.97
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole	Jenis		Nos	
Manhole	JRC 7		1	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS BANDARAYA IPOH		250	Meter
Pejabat Daerah (PD)				
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				
Lain-Lain / Tanah Persendirian				
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 23.07.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 250-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 23/07/2026	Nama: Muhammad Syahir bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 23/07/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-

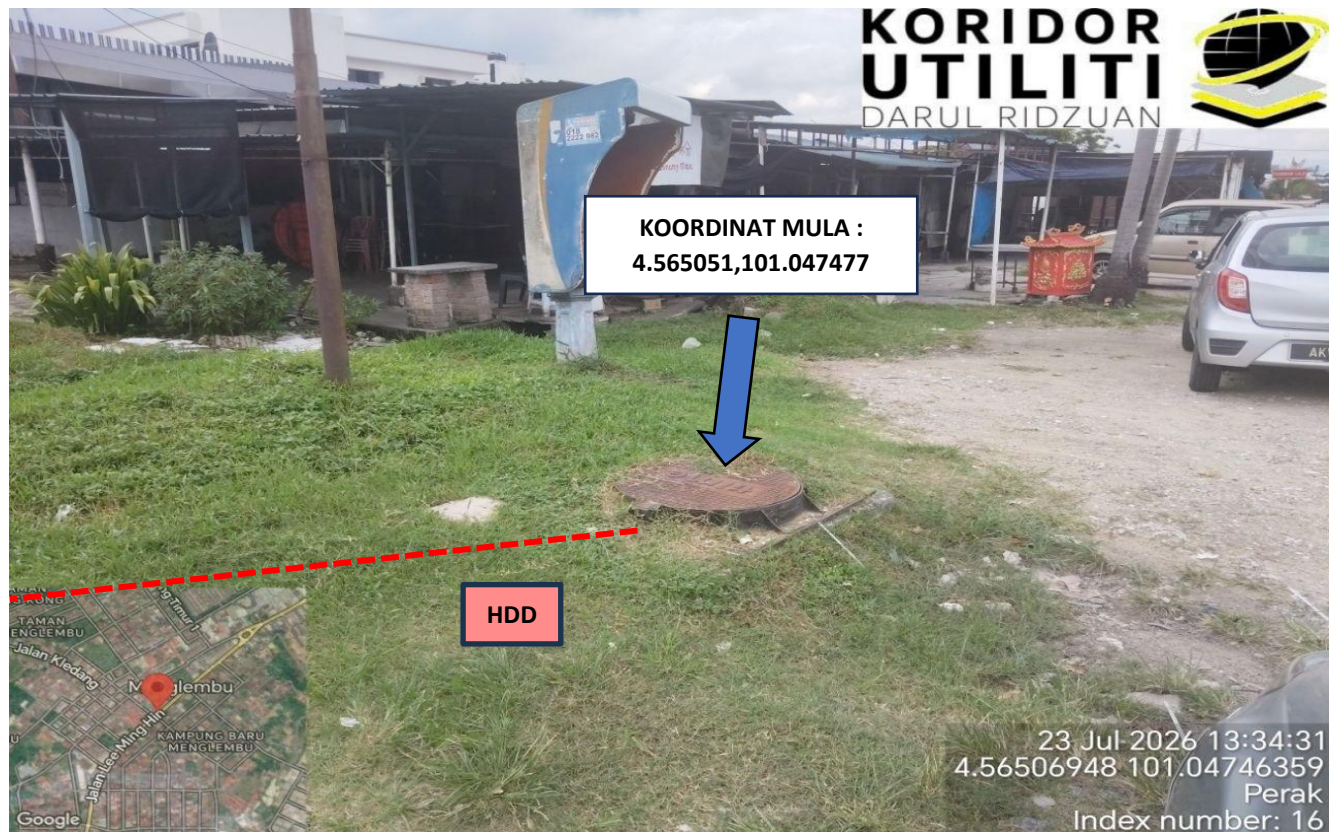


LOKASI KOORDINAT MULA KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN

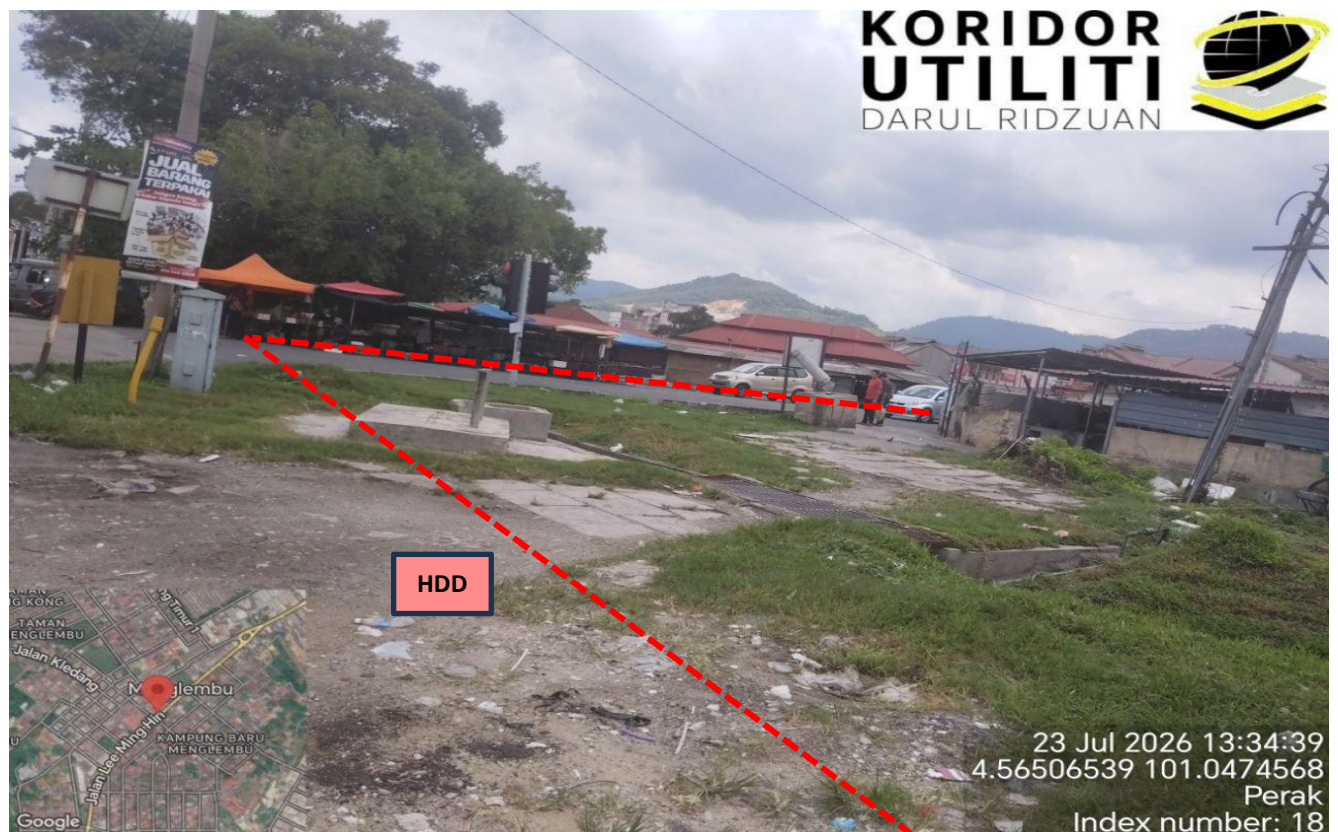

LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN (LORONG TENGAH)

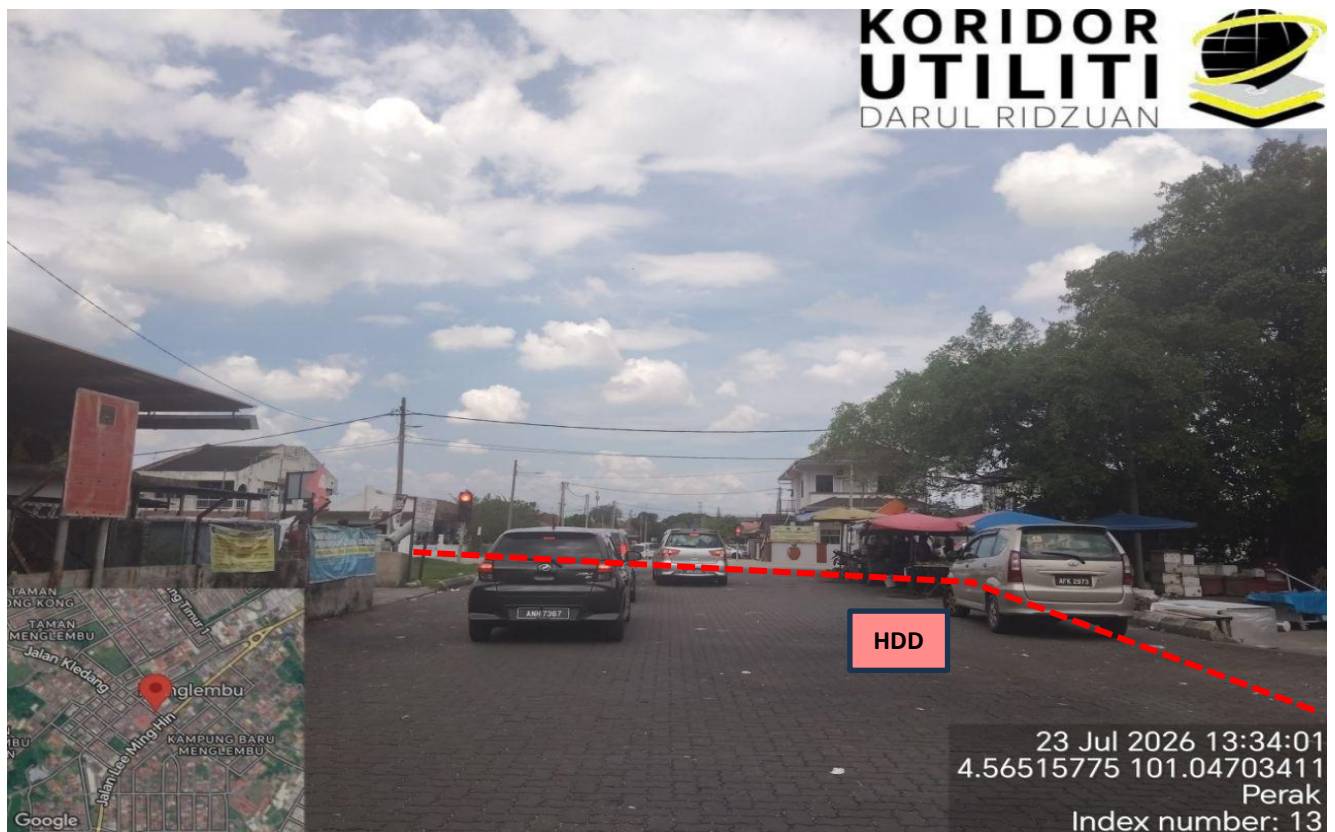

LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN LEE MING HIN (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN BESAR (LORONG TENGAH)




LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TRANCHELL (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TRANCHELL (LORONG TENGAH)



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TRANCHELL (LORONG TENGAH)

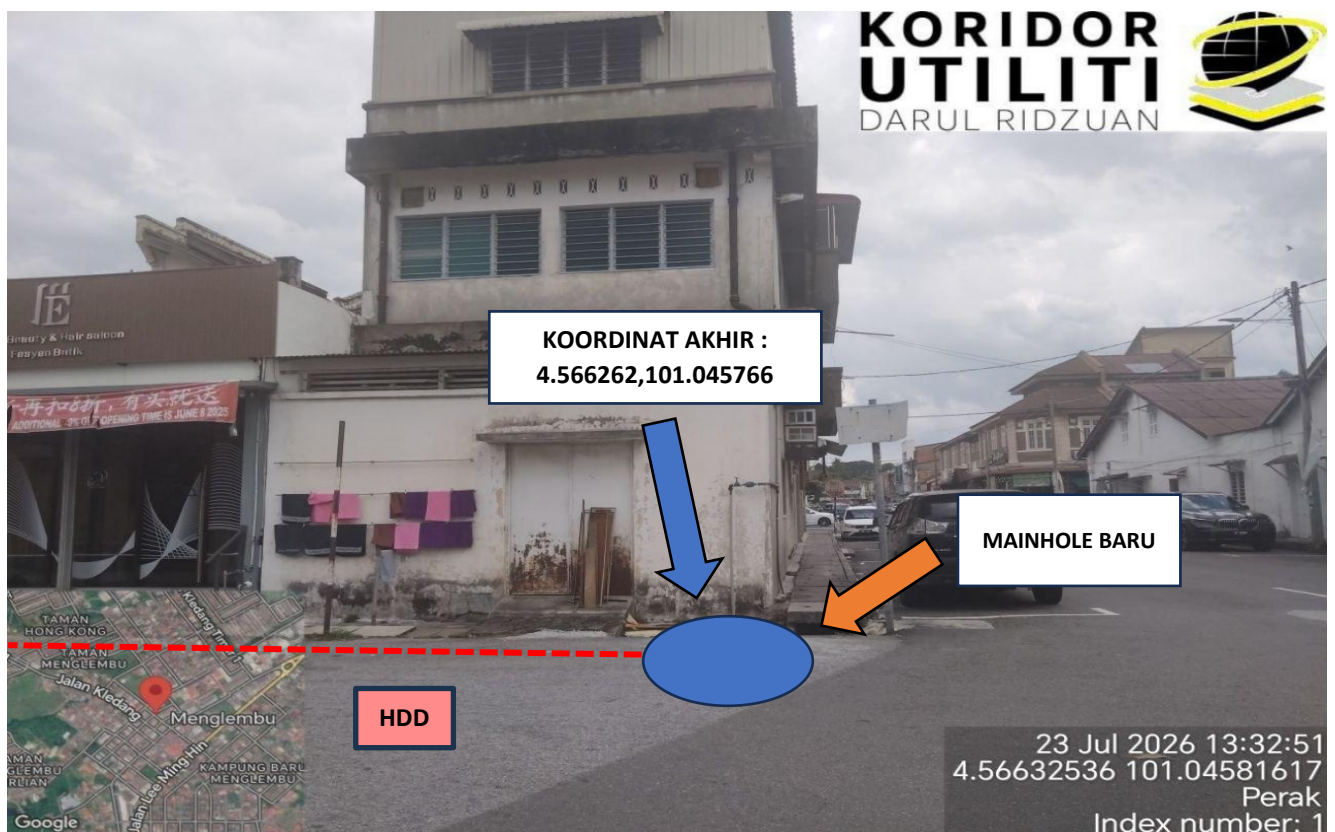

LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TRANCHELL (LORONG TENGAH)
