

TAJUK PROJEK:

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABD0086 – SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGKAI

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/KACP/A/05/25/0568
TARIKH LAWATAN:	24 JUNE 2025
DISEDIAKAN OLEH:	SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **3.961104,101.329275**

Koordinat Akhir: **3.946941,101.333315**

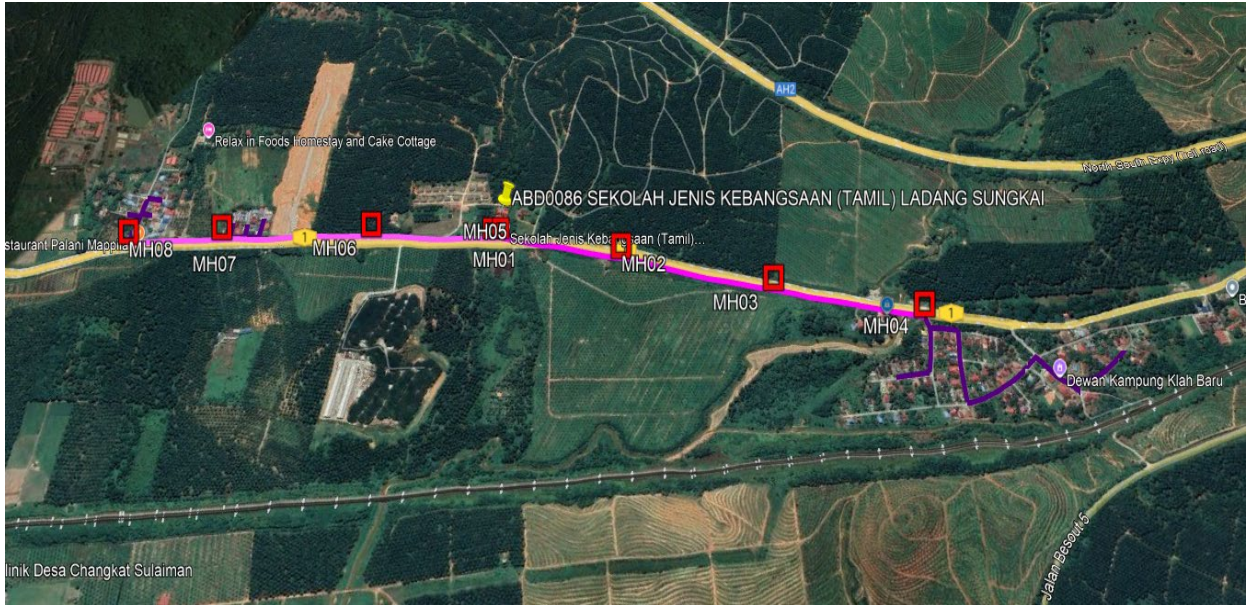

Jumlah Jarak: 3577-meter



(berdasarkan PIL-01)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Laluan Persekutuan	JKR Batang Padang	2229
2.	Kg Klah Baru Sungkai	PDT Batang Padang	1258
3.	Kg Hendra Lama	PDT Batang Padang	
4.	Kg Hendra Baru	PDT Batang Padang	
5.	Sg Klah	JPS Batang Padang	90
Jumlah Jarak:			3577

RINGKASAN LAPORAN:-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)	1994	4	Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	5		Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak:			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD		8	Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit / MH HDD	1	1	4	4
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman Tiang	Konkrit		47	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR BATANG PADANG		2229	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah (PD)	PDT BATANG PADANG		1258	Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)	JPS BATANG PADANG		90	Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1) Kaedah HDD dan pemasangan tiang bagi tujuan perkhidmatan (FDP) di jalan milik JKR 2) Cadangan penanaman tiang konkrit 9 meter di kawasan <i>crossing</i> selebihnya adalah 7.5 meter.				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 22/07/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Ketua Unit Operasi Tarikh: 22/07/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



LOKASI FDC DI HADAPAN SJKT LADANG SUNGKAI

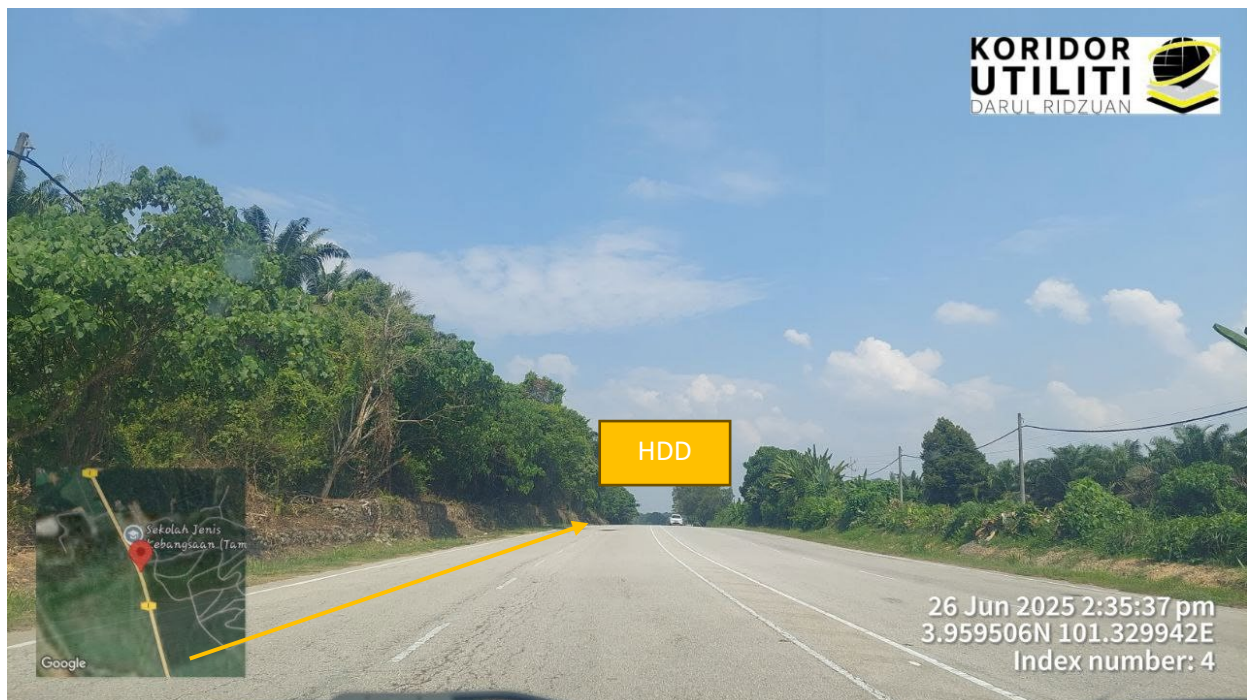

KAEDAH HDD DI LALUAN PERSEKUTUAN



KG BARU SG KLAH



CADANGAN PEMASANGAN UTILITI



LOKASI DI KG HENDRA LAMA



KG HENDRA BARU



JAJARAN MENGIKUT TIANG TNB SEDIA ADA



PERBINCANGAN DI TAPAK BERSAMA PEMOHON DAN PIHAK JKR
