

TAJUK PROJEK:

CADANGAN RETIKULASI AIR BAGI CADANGAN PEMBINAAN SKIM PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI: I) FASA 1: 16 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT (JENIS A) DI ATAS LOT 357699-LOT 357714 II) FASA 2: 16 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT (JENIS A) DI ATAS LOT 357682-LOT 357697 III) FASA 3: 14 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT (JENIS B) DI ATAS LOT 357668-LOT 357681 DAN IV) FASA 4: 10 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT (JENIS B) DI ATAS LOT 357656-LOT 35766S DI MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN HELM CAPITAL SDN.BHD.(LOKASI:BANDAR PENKALAN INDAH, IPOH)

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/LAP/B/01/25/0093
TARIKH LAWATAN:	31 JANUARI 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.540637,101.087984**

Koordinat Akhir: **4.540291,101.088043**

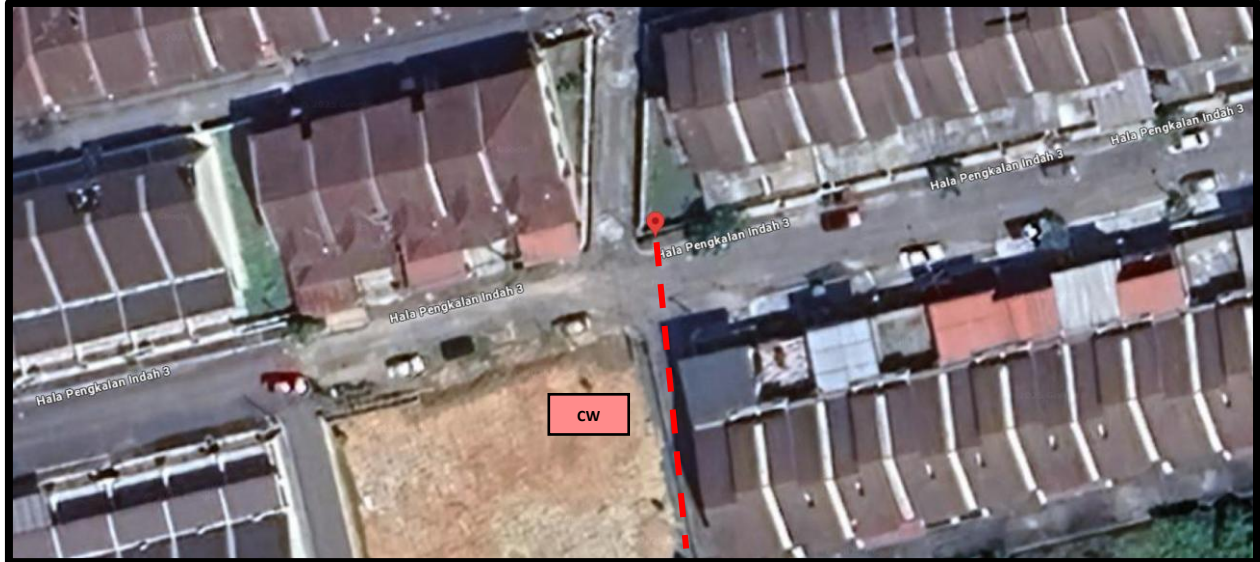



Jumlah Jarak: 39 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	PERSIARAN PENGKALAN INDAH 3	MBI	39 m
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			39 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	39	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		39	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	39	0.6	1.5	35.1
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		39	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 39-meter menggunakan kaedah <i>Carriage Way Open Cut</i> adalah TIADA HALANGAN.				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Harrith Bin Muhtar Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 31/01/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 31/01/2025


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN PENGKALAN INDAH 3

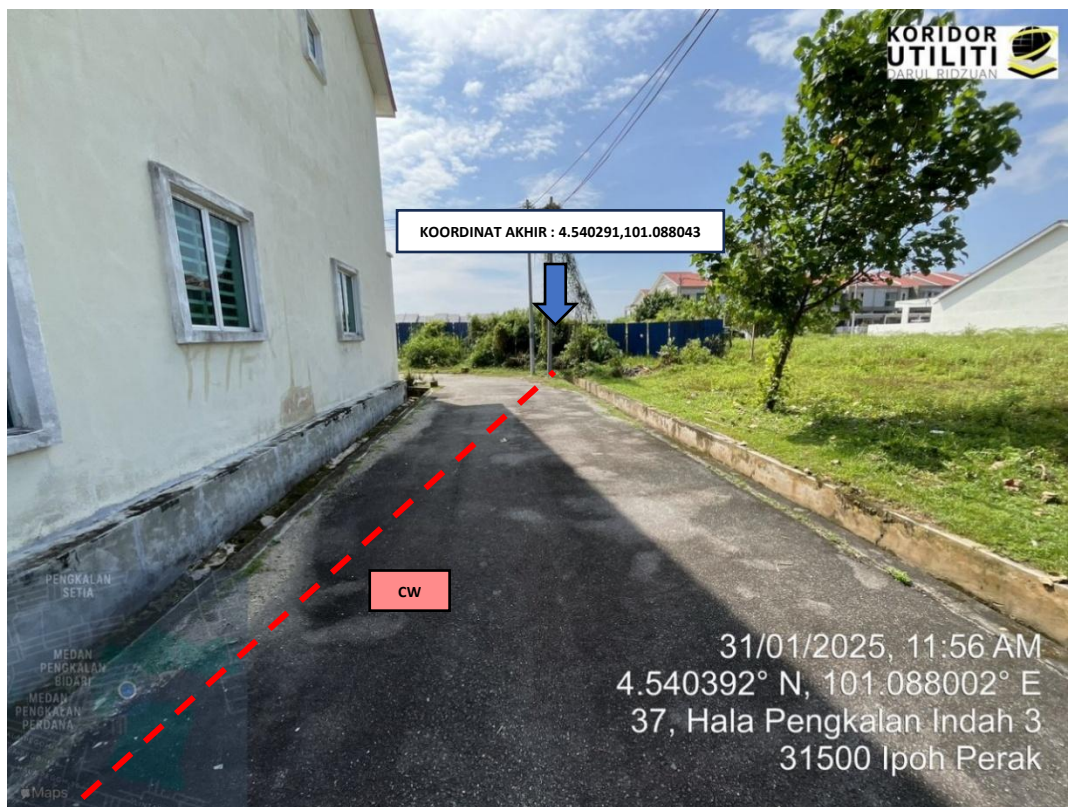

JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN PENGKALAN INDAH 3

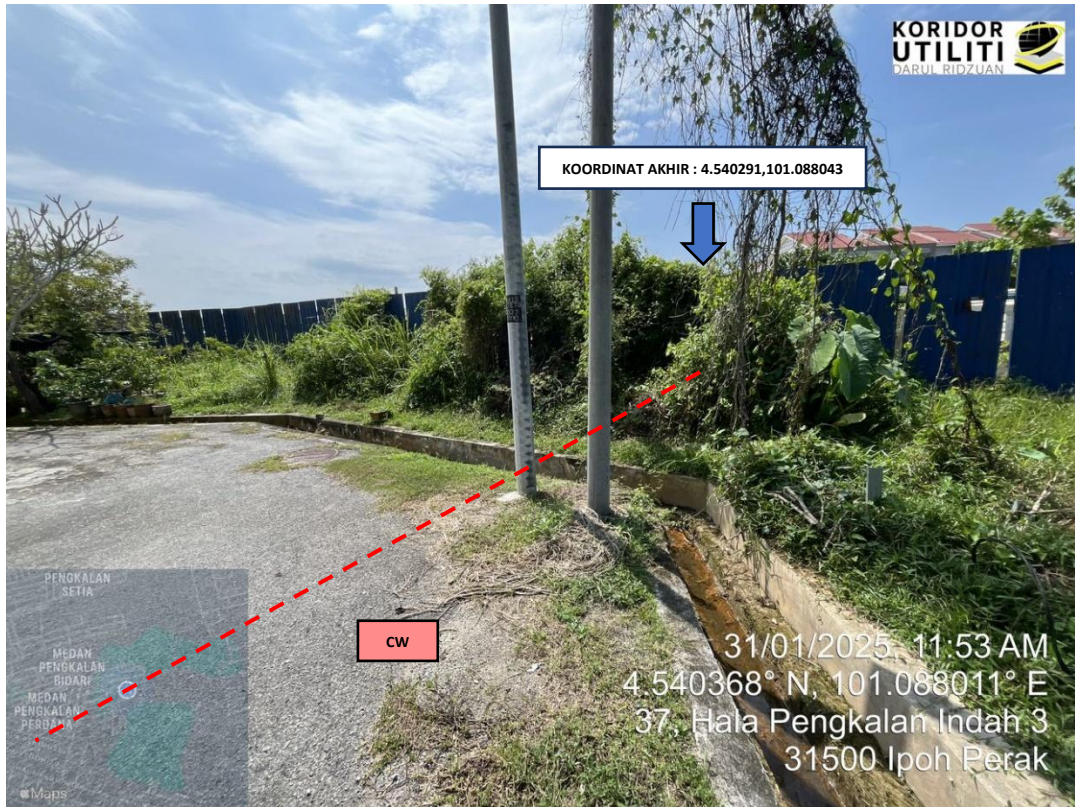

LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN PERUSAHAAN KLEDANG UTARA 1/1
