

TAJUK PROJEK:

MSVT PUNCA BEKALAN BARU 2 X 500MMP DARI PMU PROTON CITY KE SSU IQM BAGI PERTAMBAHAN BEBAN BARU DI KAWASAN INDUSTRI PROTON CITY(TJM5404,TJM5434&TJM5436)

**LAPORAN LAWATAN TAPAK
AWALAN**

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN





| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| NO. RUJUKAN FAIL: | KUDR/TNBB/A/02/25/0168 |
| TARIKH LAWATAN: | 10 MAC 2025 |
| DISEDIAKAN OLEH: | NOOR EDRYNN BIN ABDUL HATAB |





Jumlah Jarak: 7097 METER (Berdasarkan Pelan Izin Lalu, PIL dan termasuk jarak kawasan persendirian)

RINGKASAN LAPORAN:-

| Kaedah Cadangan | Jarak, m | Kedalaman, m | Unit | |
|---|--------------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| Horizontal Directional Drilling (HDD) | 5869 | 4 | Meter | |
| Pipe Jacking | | | Meter | |
| Open Cut Trenching (Carriage Way) | | | Meter | |
| Open Cut Trenching (Grass Verge Way) | 334 | 1.5 | Meter | |
| Jumlah Jarak : | | | Meter | |
| Bilangan Pit/ Manhole | | | Kuantiti | |
| Cadangan Manhole (Telekomunikasi) | | | Nos | |
| Cadangan Pit HDD | | | 70 Nos | |
| Cadangan Pit Pipe Jacking | | | Nos | |
| Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut) | Panjang, m | Lebar, m | Kedalaman, m | Unit, m³ |
| Carriage Way Open Cut Trenching | | | | |
| Grass Verge Way Open Cut Trenching | | | | |
| Cadangan Pit HDD | 5869 | 0.6 | 4 | 14085.6 |
| Cadangan Pit Pipe Jacking | | | | |
| Lain-lain | Jenis | | Nos | |
| Penanaman tiang | | | | |
| Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa | Pihak Berkuasa | | Jarak | Unit, m |
| Jabatan Kerja Raya (JKR) | JKR MUALLIM | | 1497 | Meter |
| Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) | MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM | | 4706 | Meter |
| Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) | | | | Meter |
| Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) | | | | Meter |
| Lain-Lain / Tanah Persendirian | PROTON | | 894 | Meter |
| Nota Tambahan: | | | | |
| <p>1. Pemohon ingin menggunakan UDM KUDRAT bagi keseluruhan projek ini.</p> <p>2. Pemohon meminta anggaran jarak antara Pit dan Pit bagi kaedah HDD sebanyak 100 meter, lokasi sebenar boleh dberikan selepas semakan UDM selesai kerana Unit Ukur TNB memerlukan data tersebut untuk menyatakan lokasi Pit. Anggaran pit bagi MDTM sekitar 47 Pit, JKR 14 Pit dan Private 9 Pit.</p> | | | | |
| Disediakan: | | | Disemak: | |
|  Nama: NOOR EDRYNN BIN ABDUL HATAB Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 08/05/2025 | | |  Nama: KAMARUL AZIAN BIN KAMARUZAMAN Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 08/05/2025 | |



KAEDAH HDD DI JALAN PC10



KAEDAH HDD DI JALAN PC10



KAEDAH HDD DI LEBUHRAYA PROTON CITY, PINDAAN TP




BERSAMA PIHAK MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM DAN PEMOHON



KAEDAH CW DI JALAN JELAWAI 2, PINDAAN TP



KAEDAH CW DI JALAN JELAWAI 2, JALAN JELAWAI 5, PINDAAN TP

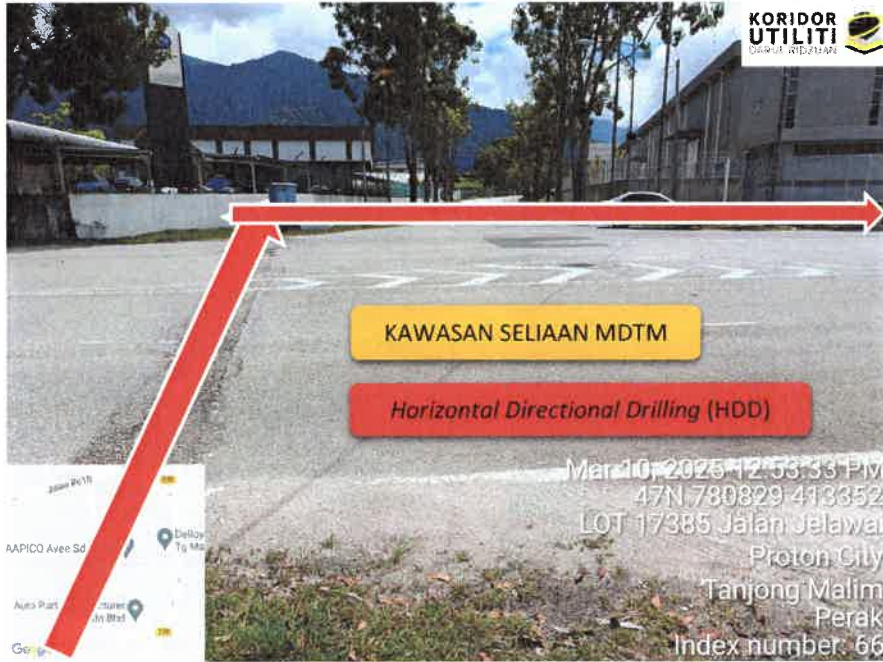

KAEDAH HDD DI JALAN JELAWAI 2



KAEDAH HDD DI JALAN JELAWAI 2



KAEDAH HDD DI LEBUHRAYA PROTON CITY



KAEDAH HDD DI JALAN BUNGA TANJUNG
