

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG KEJURUTERAAN BESI DI ATAS LOT 126749, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14, KAWASAN PERINDUSTRIAN MENGLEMBU, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, IPOH, PERAK TETUAN CCK ENGINEERING & TRADING SDN BHD (PEMAJU KEPADA EN. CHAN CHEE KONG)

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/10/24/0085
TARIKH LAWATAN:	18 OKTOBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.5712, 101.058571**

Koordinat Akhir: **4.571319, 101.058509**





Jumlah Jarak: 15 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14	MBI	15 m
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			15 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	15	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		15	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	15	0.6	1.5	13.5
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		15	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 15-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> adalah TIADA HALANGAN. Paip/kabel/saluran yang perlu melintasi longkang hendaklah ditanam dengan kedalaman melebihi daripada paras bawah longkang iaitu 1-meter dari bawah paras longkang atau menggunakan <i>GI conduct pipe</i> yang akan melalui bukaan longkang (perlu sertakan perincian struktur longkang). 				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 21/10/2024	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 21/10/2024


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

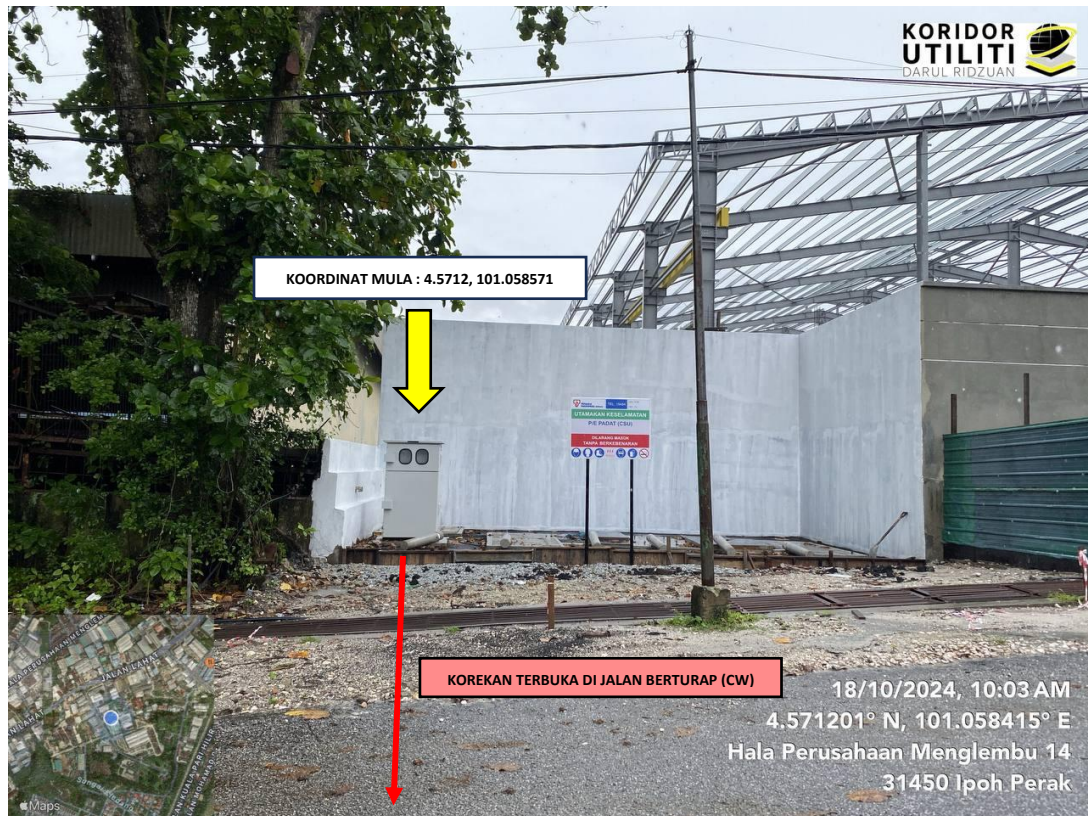


KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA JALAN BERTURAP DI HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14



JAJARAN KOREKAN TERBUKA JALAN BERTURAP DI HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14

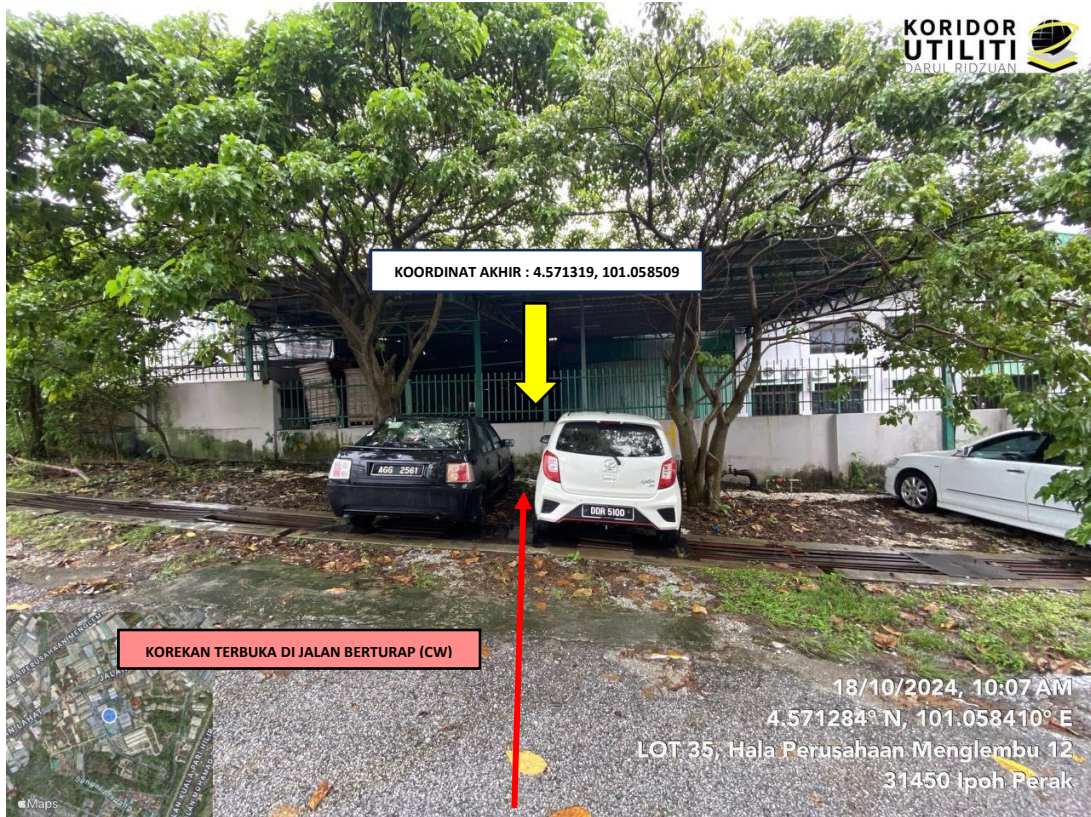

KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA JALAN BERTURAP DI HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14

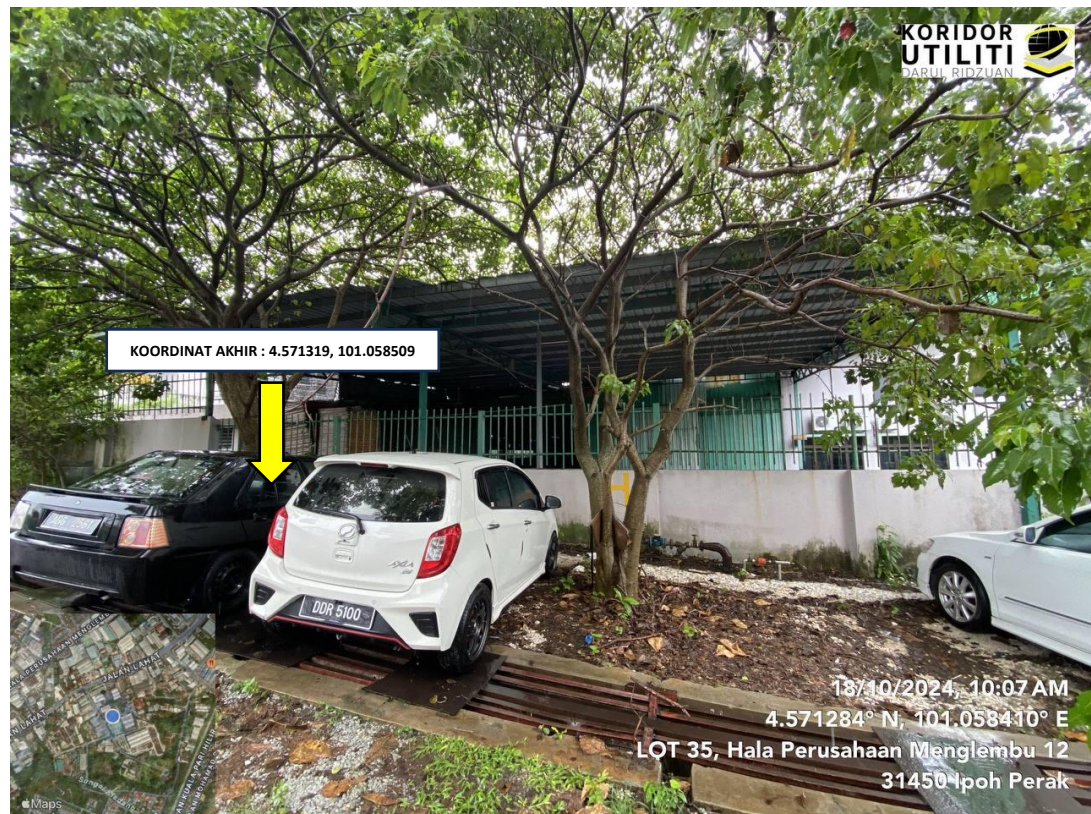

KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA JALAN BERTURAP DI HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 14
