

TAJUK PROJEK:

SEBUTHARGA KERJA MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PAIP JENIS DUCTILE IRON SAIZ 300MM BAGI MENGGANTIKAN PAIP SEDIAADA JENIS HDPE 345MM DAN 200MM HDPE SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PORTLAND, TASEK, PERAK BAGI TEMPOH ENAM BELAS (16) MINGGU.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/LAP/A/05/25/0513
TARIKH LAWATAN:	28 MEI 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula :4.642670,101.101114

Koordinat Akhir: 4.638374,101.106703





Jumlah Jarak: 781 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN PORTLAND	MBI	781 METER
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			781 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	781	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		781	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	781	0.6	1.2	562.32
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		781	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 23.05.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 781-meter menggunakan kaedah Open Cut Trenching (carriage way). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak MBI akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhammad Harrith Bin Muhtar Jawatan: penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 28/05/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 28/05/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

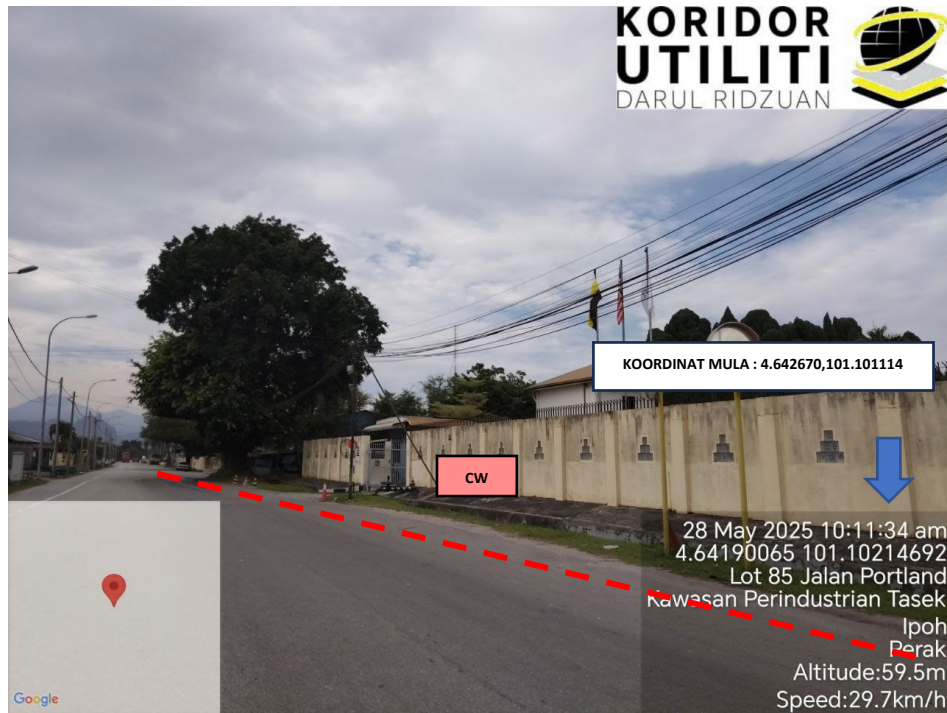

LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN PORTLAND

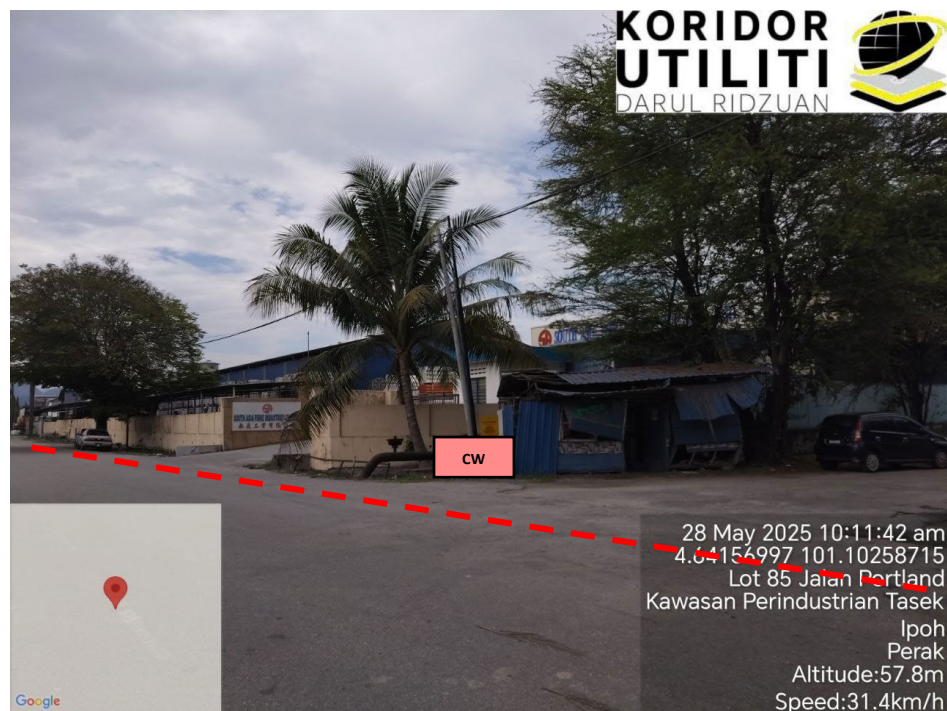


JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PORTLAND




28 May 2025 10:12:07 am
4.6404894 101.10401735
Lot 85 Jalan Portland
Kawasan Perindustrian Tasek
Ipoh
Perak
Altitude:60.2m
Speed:5.4km/h

JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PORTLAND

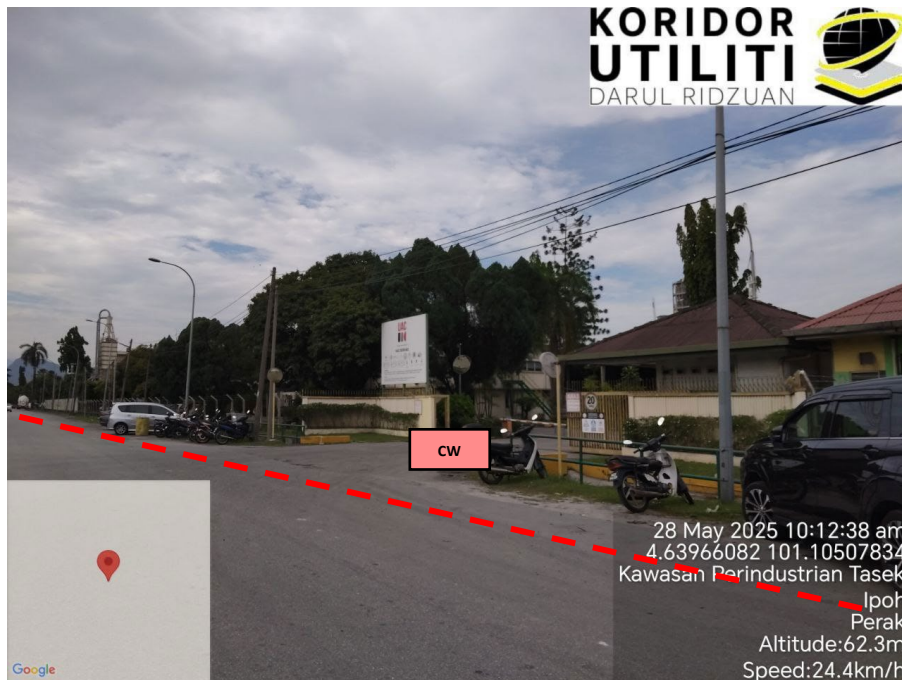


28 May 2025 10:12:38 am
4.63966082 101.10507834
Kawasan Perindustrian Tasek
Ipoh
Perak
Altitude:62.3m
Speed:24.4km/h

JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PORTLAND

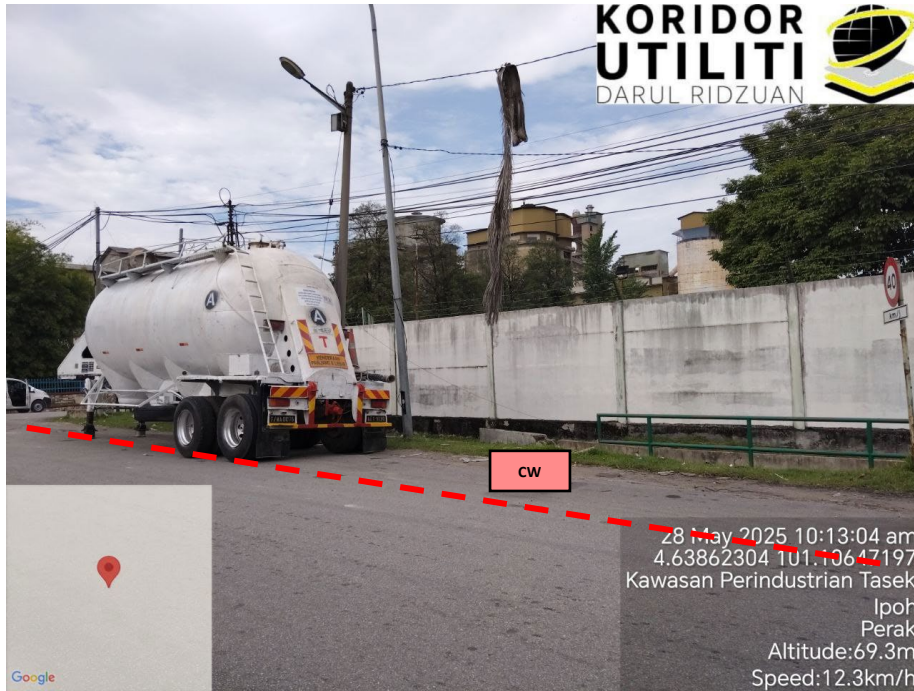

GAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PORTLAND

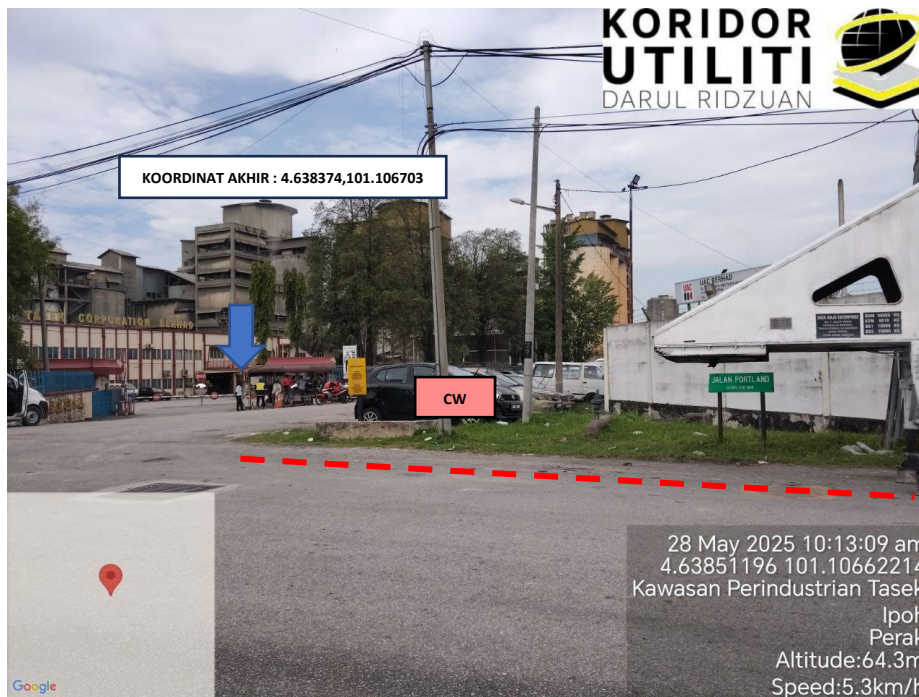

LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI JALAN POTLAND
