

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN IZIN LALU BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH MASJID IMAM AS SYAFIE 1 TINGKAT,3 UNIT KUARTERS,3 UNIT KEDAI PEJABAT 1 TINGKAT DI ATAS PT 275458 MERU RAYA PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/01/25/0071
TARIKH LAWATAN:	05 FEBRUARI 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.68802,101.082529
 Koordinat Akhir: 4.68802,101.082787
 Koordinat Mula: 4.689032,101.083038
 Koordinat Akhir: 4.68802,101.082787
 Koordinat Mula : 4.689921,101.082343
 Koordinat Akhir : 4.689746,101.08231

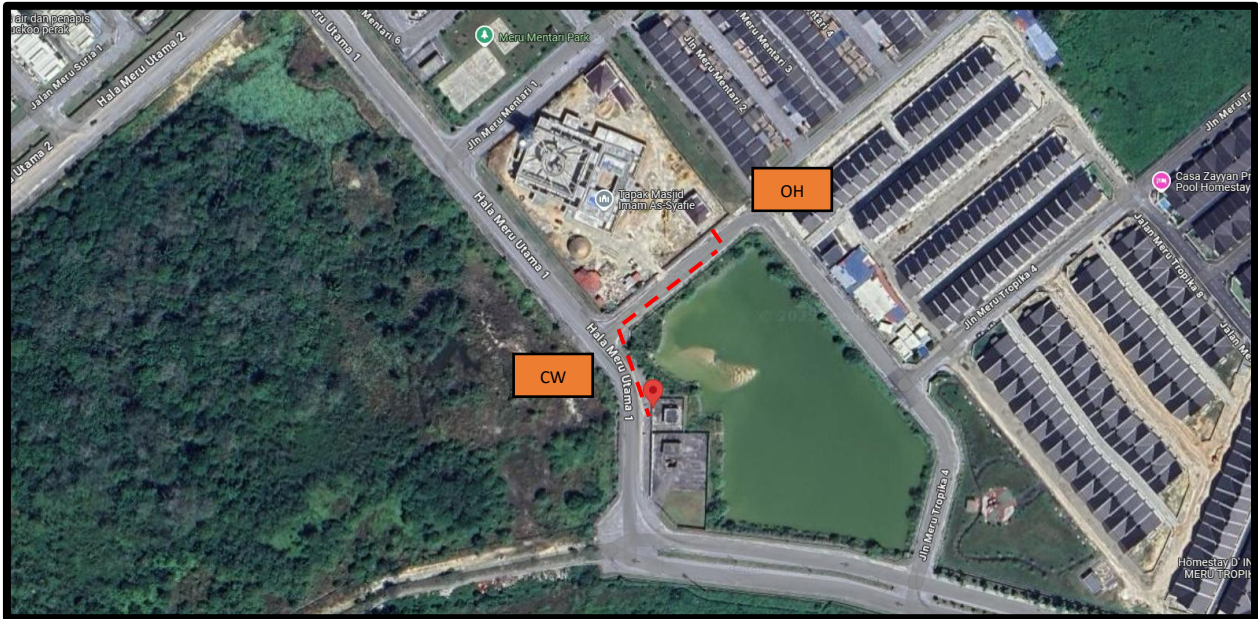



Jumlah Jarak: 179meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	HALA MERU UTAMA 1	MBI	123
2.	JALAN MERU MENTARI 1	MBI	20
3.	HALA MERU UTAMA 1	MBI	36
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			179 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	123	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		179	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole/Tiang		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Penanaman tiang		2	Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	123	0.6	1.5	110.7
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		179	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Kerja-kerja penarikan kabel dan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 179-meter menggunakan kaedah korekan terbuka adalah TIADA HALANGAN.				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Harrith Bin Muhtar Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 05.02.2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 05.02.2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

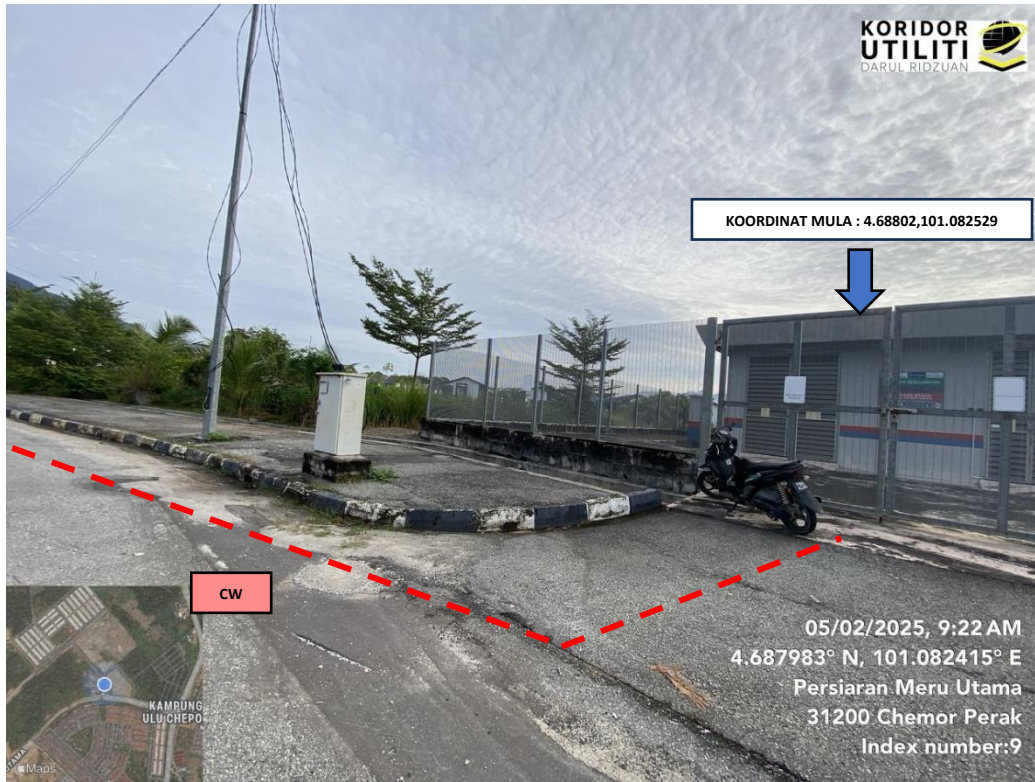


LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI HALA MERU UTAMA 1




JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI HALA MERU UTAMA 1




JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI HALA MERU UTAMA 1

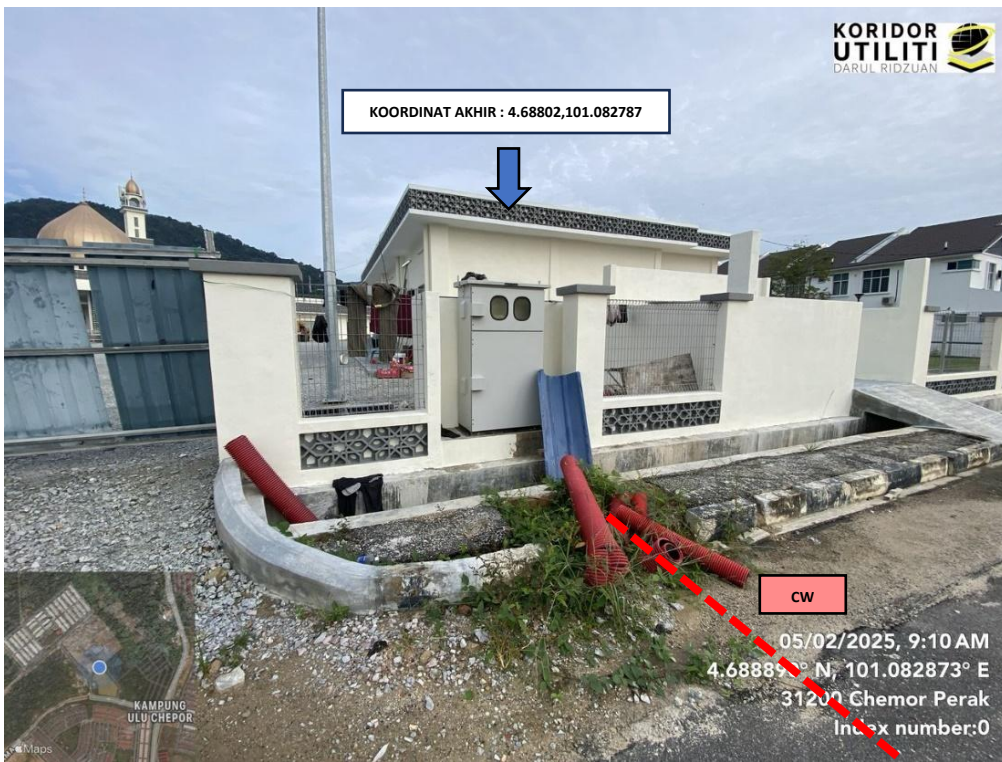

LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI HALA MERU UTAMA 1

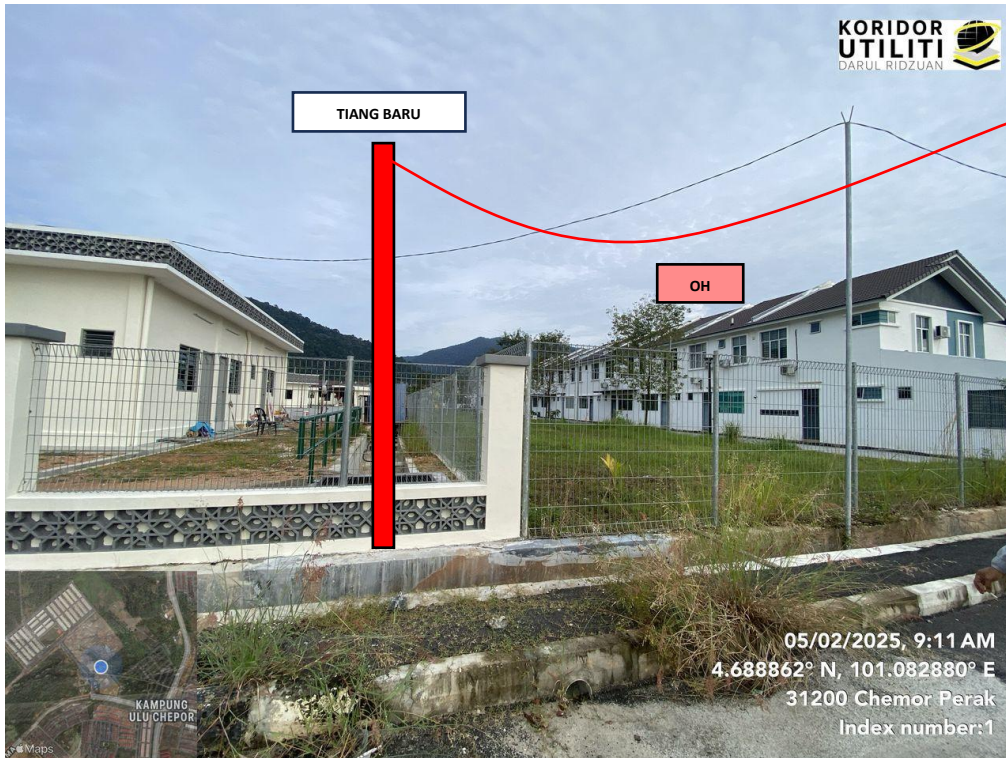

LOKASI PENANAMAN TIANG DAN CABLE PULLING KE TIANG SEDIAADA DI JALAN MERU MENTARI 1

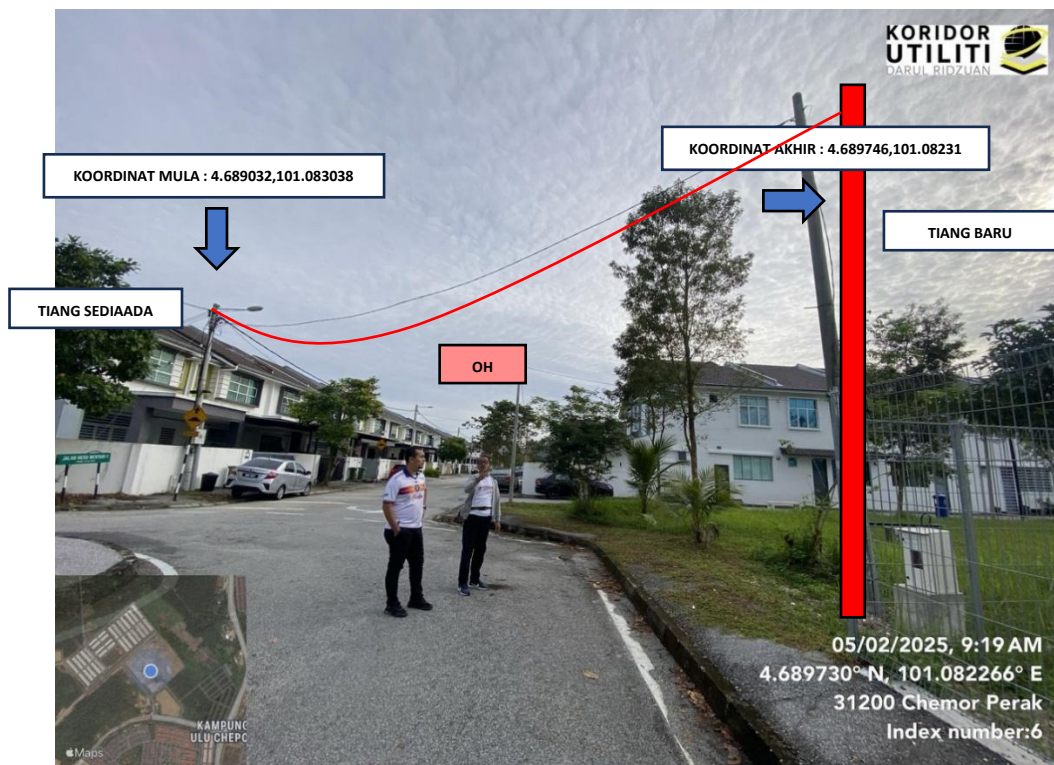

LOKASI PENANAMAN TIANG DAN CABLE PULLING DARI TIANG SEDIAADA DI JALAN MERU MENTARI 1
