

TAJUK PROJEK:

CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEMBANGUNAN FASA 1A2 YANG MENGANDUNGI 17 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT JENIS KP1 (24' X 70') DI ATAS PLOT 36 - PLOT 52 DI ATAS LOT 355516 (PT 203091 / HSD 136262), MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN. UNTUK TETUAN ZAMAN TELADAN SDN. BHD. (LOKASI : MERU PERDANA 2)

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/12/24/0187
TARIKH LAWATAN:	19 DISEMBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI


LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.686828,101.089213**

Koordinat Akhir: **4.686100,101.089113**

Koordinat Mula: **4.685951,101.087175**

Koordinat Akhir: **4.685581,101.089113**

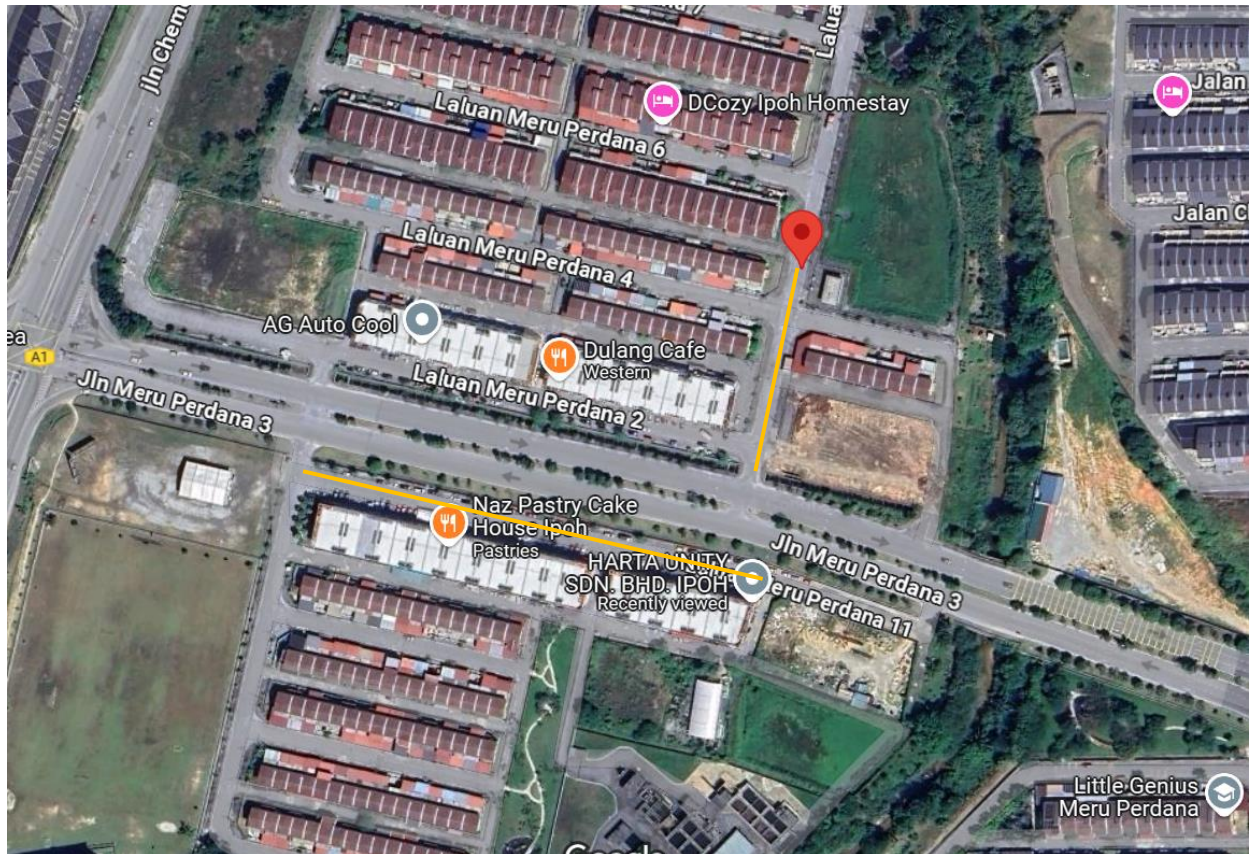

Jumlah Jarak: 318 meter



(jarak berdasarkan PIL)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Laluan Meru Perdana 3	MBI	82 m
2.	Laluan Meru Perdana 11	MBI	236 m
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			318 m

RINGKASAN LAPORAN:-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit		
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter		
Pipe Jacking			Meter		
Open Cut Trenching (Carriage Way)	318	1.5	Meter		
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter		
Jumlah Jarak :		318	Meter		
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit		
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos		
Cadangan Pit HDD			Nos		
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos		
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)		Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching					
Grass Verge Way Open Cut Trenching		318	0.6	1.5	286.2
Cadangan Pit HDD					
Cadangan Pit Pipe Jacking					
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)		Jenis		Nos	
Manhole					
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa		Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)					Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)		MAJLIS BANDARAYA IPOH		318	Meter
Pejabat Daerah (PD)					Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)					Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian					Meter
Nota Tambahan: -					
<p>1) Korekan di Laluan Meru Perdana 11 hendaklah menggunakan jajaran paling tepi di bahagian road kerb.</p> <p>2) Korekan di Laluan Meru Perdana 11 (kawasan unit kedai) sahaja diberi kebenaran untuk melakukan kerja pada waktu malam (10.00 malam – 6.00 pagi).</p>					

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 20/12/2024	Nama: Kamarul Azlan Bin Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 20/12/2024

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI DI LALUAN MERU PERDANA 3



KOREKAN TERBUKA SEPANJANG 82 METER



KOORDINAT MULA DARI FEEDER PILLAR SEDIA ADA



LOKASI DI LALUAN MERU PERDANA 11



Koordinat Akhir:
4.686100,101.089113

OPEN CUT (CW)

19 Dec 2024, 10:17:56 am
4.685521N 101.089092E
67 Laluan Meru Perdana 11
Ipoh
Perak
Index number: 189

