

TAJUK PROJEK:

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABC0067 - SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MENG

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/KACP/A/05/25/0419
TARIKH LAWATAN:	24 JUNE 2025
DISEDIAKAN OLEH:	SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **3.996745,101.310309**
 Koordinat Akhir: **3.998838,101.312837**





Jumlah Jarak: 1298-meter
(berdasarkan PIL-01)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Jalan Sungkai	JKR Batang Padang	101
2.	Jalan Menderang A133	JKR Batang Padang	
3.	Jalan Pasar	MD Tapah	1197
4.	Jalan TOJ 2	MD Tapah	
5.	Jalan TOJ 2/3	MD Tapah	
6.	Jalan TOJ 1	MD Tapah	
7.	Lorong Orkid 3/2	MD Tapah	
Jumlah Jarak:			1298

RINGKASAN LAPORAN:-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	9		Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak:			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			3	Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Pit Pipe Jacking				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit / MH HDD	1	1	4	4
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman Tiang	Konkrit		46	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR BATANG PADANG		101	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS DAERAH TAPAH		1197	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1) Cadangan penanaman tiang konkrit 9 meter di kawasan <i>crossing</i> selebihnya adalah 7.5 meter.				
2) Penggunaan tiang 9 meter di Jalan Menderang A133				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 11/07/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Ketua Unit Operasi Tarikh: 11/07/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



LOKASI DI SJKC KHAI MENG

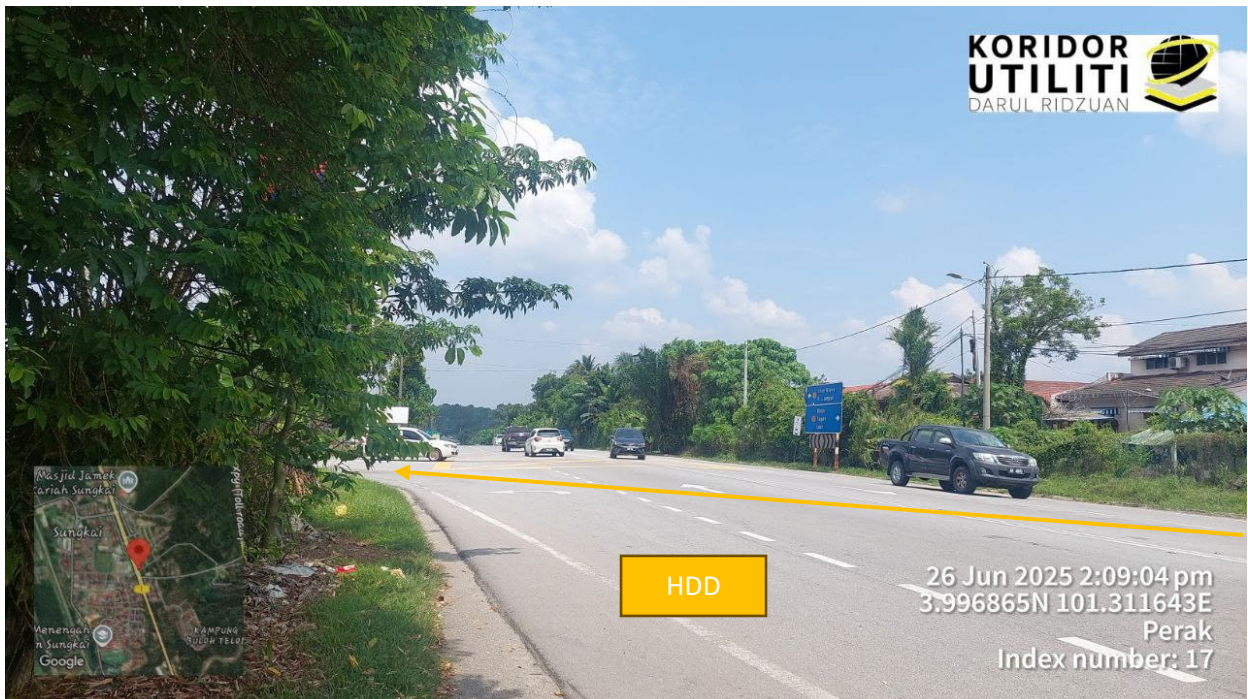

DI JALAN SUNGKAI



CADANGAN PEMASANGAN UTILITI





26 Jun 2025 2:10:16 pm
3.996205N 101.312636E
Perak
Index number: 19



Tuesday, June 24, 2025 12:40:28
3.997565N 101.311242E
Sungkai
Perak
Index number: 16

PERBINCANGAN DI TAPAK BERSAMA PJ NAIM DAN PEMOHON
