

TAJUK PROJEK :

PERMOHONAN KERJA PENGOREKAN JALAN MENGGUNAKAN KAEDAH "PIPE JACKING" BAGI PENYAMBUNGAN PAIP UTAMA LAP

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/LAP/B/05/24/0002
TARIKH LAWATAN:	07/06/2024
DISEDIAKAN OLEH:	MOHD SHAHRUL AZRI

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 3.976012,101.112103

Koordinat Akhir: 3.976172,101.111959



Jumlah Jarak : 27 meter


RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN CHANGKAT JONG	JKR HILIR PERAK	27
2.			
3.			
Jumlah Jarak:			27

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking	27	5	Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		27	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking		1	Nos	
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking	2.5	2.5	5	31.25
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR Hilir Perak		27	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

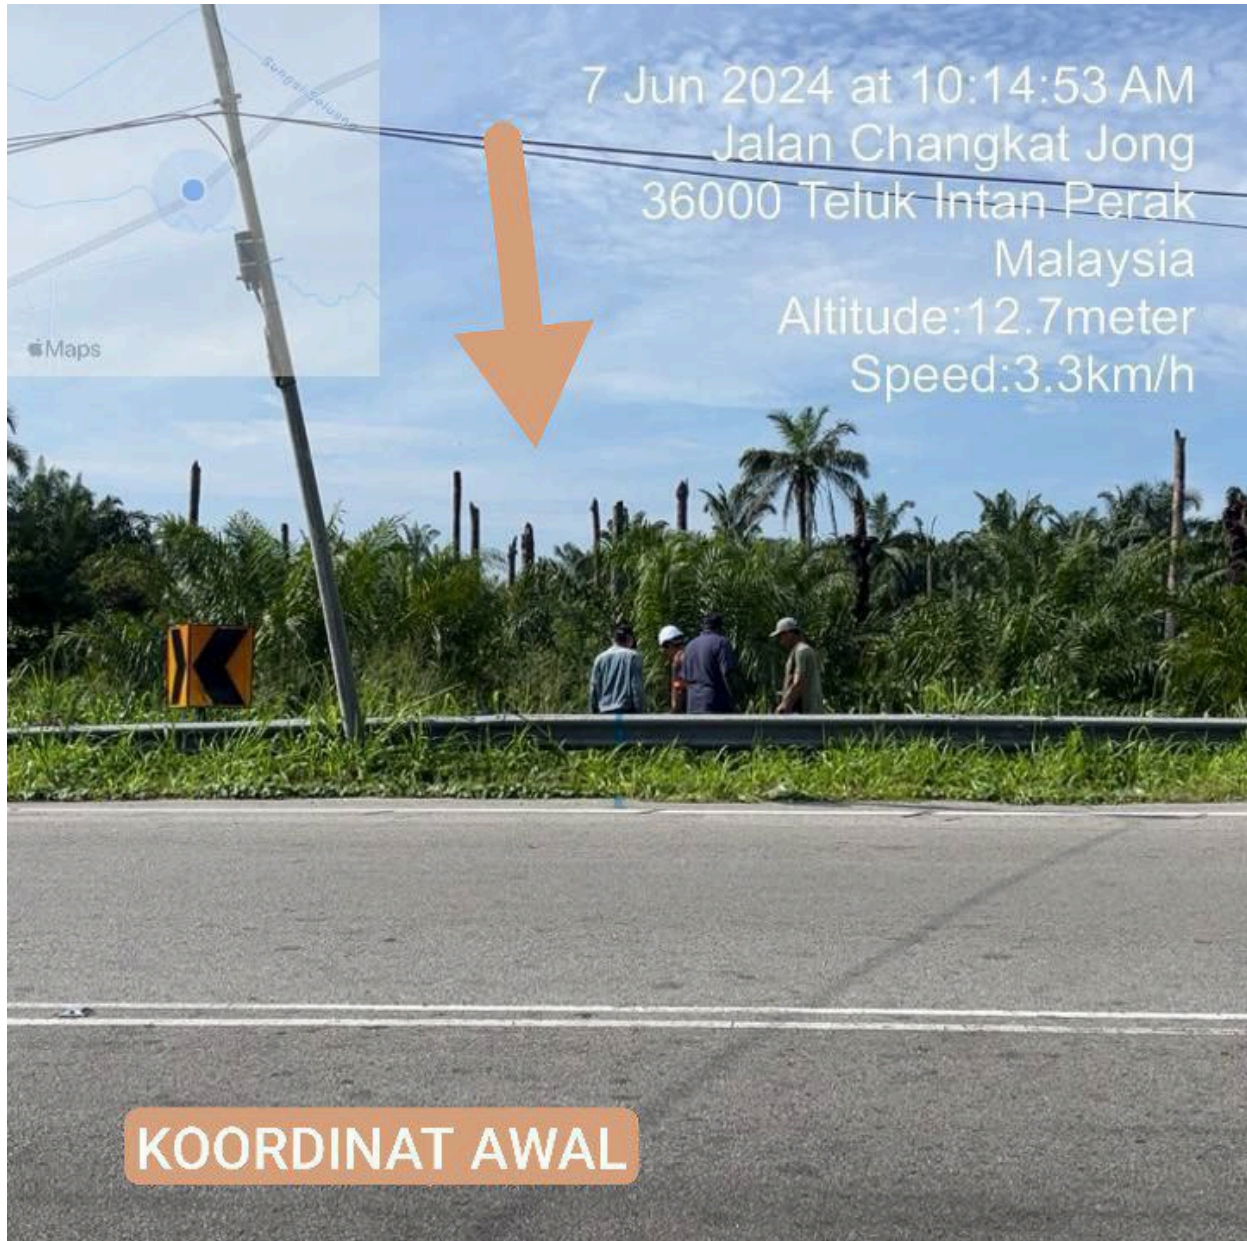

KOORDINAT MULA: 3.976012,101.112103

LOKASI DI JALAN CHANGKAT JONG



LALUAN PIPE JACKING



KOORDINAT AKHIR: 3.976172,101.111959
